

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門西小学校 その1)

- ② 車がスピードを出して走り抜けるので、危険である。

(対策内容)

横断歩道と停止線、ダイヤモンドの塗り直しを上申 【警察】☆完了




- ① 家の塀があるため、見通しが悪い。

(対策内容)

見通しがきくように、塀から遠い方を歩いて通学するように指導 【学校】☆継続



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門西小学校 その2)

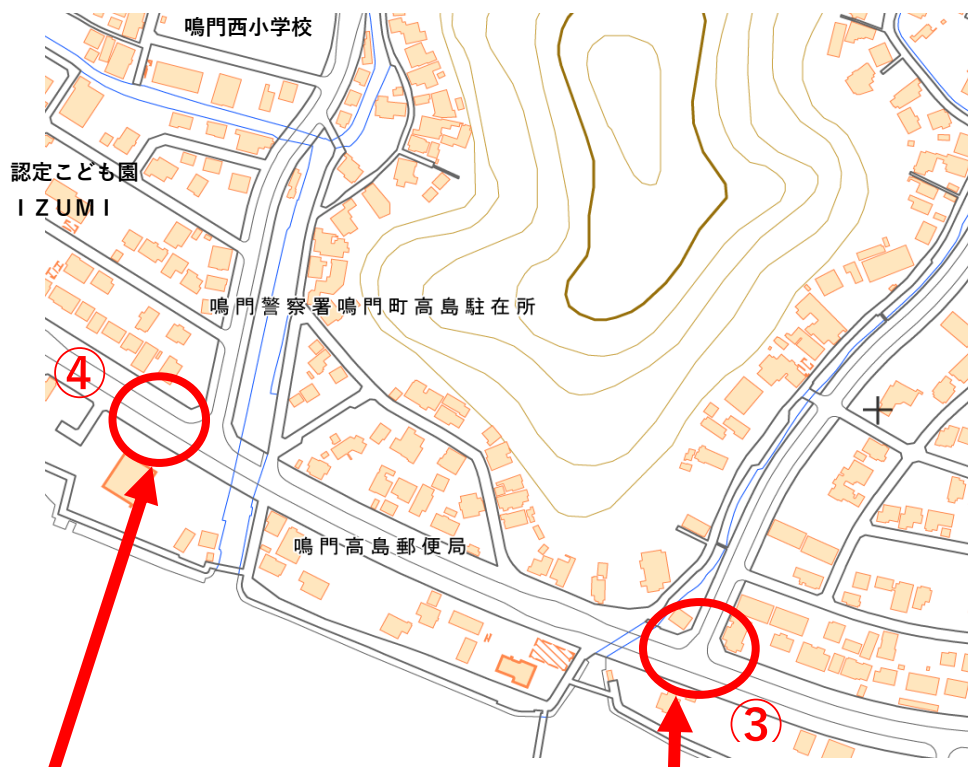

- ④ 横断歩道はあるが、車の出入りが多く、横断時に危険である。

(対策内容)

周辺のダイヤモンドの塗り直し上申

【警察】☆完了

横断時には、しっかり手を挙げて自動車への意思表示をしてから渡るように指導


【学校】☆継続

- ③ 車が一時停止せず、そのまま進入するので危険である。

(対策内容)

横断時には、しっかり手を挙げて自動車への意思表示をしてから渡るように指導

【学校】☆継続

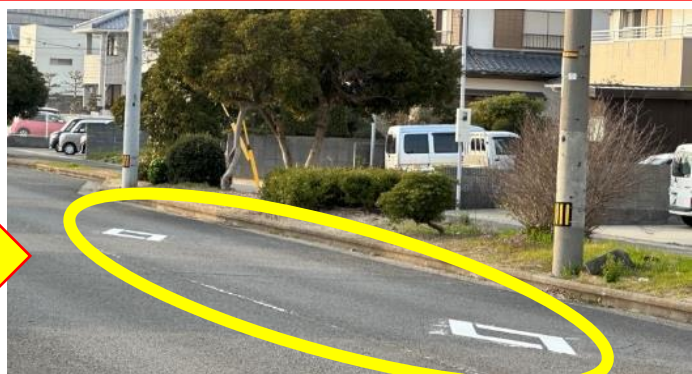

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門西小学校 その3)

- ⑨ 横断歩道はあるが、速度を落とさず通過する車が多く危険である。

橋脚があるため安全確認がしにくく、身を乗り出すようにして確認しなければならない。

(希望) 一時停止の標識か押しボタン信号を設置してほしい。


(対策内容)

止まれ表示の設置

【市教委】☆完了

止まれ表示で一旦止まり、カーブミラーで安全を確認

してから、横断するように指導 【学校】☆継続

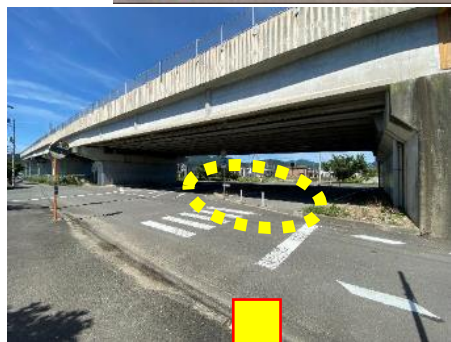

- ⑤ 小鳴門大橋側道から入ってくる車が死角に入って見えにくい。

(対策内容)

カーブミラーの角度を調節

【市土木】☆完了



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図
(鳴門西小学校 その4)



- ⑥ 朝の時間帯は児童が多く、道幅が狭く、車の通行も多いため危険である。
幼稚園への送迎の車が多い。
曲がり角は、民家の塀が高く見通しも悪い。

(対策内容)

止まれマークの設置 【市教委】☆完了

止まれマークで一旦止まってから、カーブミラーで安全を確認するように指導


【学校】☆継続

※カーブミラーの角度はすでに調整済み

【市土木】☆完了



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門西小学校 その5)

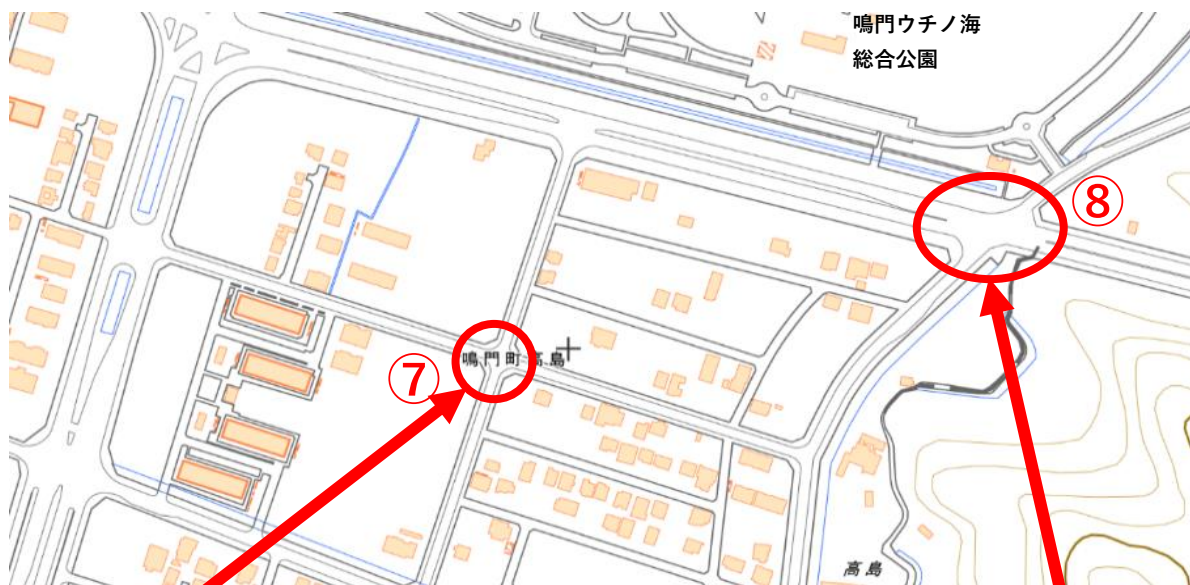

- ⑦ どちらの道が優先かわかりにくく、車が徐行せずに通る。
横断歩道がないため、車が減速しない。
ショートカットのために通行している車があり、スピードが出ていることが多い。

(対策内容)

指導停止線の塗り直し検討

【市土木】☆予定

横断する前に、左右の安全をしっかりと確認するように指導 【学校】☆継続



- ⑧ 車がスピードを出していて、危険である。中央分離帯に草が生い茂っており、歩行者・車双方から見通しが悪い。
横断歩道が長い。

(対策内容)

周辺の草を定期的刈る 【県土木】☆継続

導流帯の塗り直し検討 【県土木】☆完了

横断旗の数を増やし、横断時には使うように指導 【学校】☆継続

