

第五次鳴門市総合計画

実施計画

平成18年(2006年)度～平成20年(2008年)度

平成18年度実績まとめ

平成19年8月

鳴門市

目 次

I 実施計画の実績の取りまとめについて	1	第3章 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり	35
II 総合計画体系図	2	第1節 循環型の地域環境づくり	35
III 実施計画総括表	5	第2節 いのちを大切にす地域づくり	39
IV 実施計画実績		第3節 安心に包まれた暮らしづくり	44
第1章 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり	7	第4章 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり	46
第1節 地域活力の都市基盤づくり	7	第1節 たくましい個性あふれるひとづくり	46
第2節 快適な潤いのある住環境づくり	12	第2節 文化にふれあう感性豊かなひとづくり	53
第3節 創造力に富んだ産業・観光づくり	15	第5章 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり	56
第4節 世界に開く情報のまちづくり	21	第1節 市民と協働する開かれたまちづくり	56
第2章 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり	23	第2節 時代を拓く行財政のシステムづくり	58
第1節 とともに支え合う地域社会づくり	23		
第2節 すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり	27		
第3節 いきいきと暮らせる健康づくり	32		

I 実施計画の実績の取りまとめについて

1 本市では、第五次鳴門市総合計画に基づき、計画的かつ効率的な行財政運営を進めるため、向こう3か年の具体的施策・事業を示した実施計画を策定しています。

実施計画の進捗状況を把握し、必要に応じ所要の見直しを行うため、平成18年度末時点での進捗状況をまとめました。

2 個別の各事業について、左側には平成18年度実施計画の内容、右側には平成18年度の実績【実施内容・進捗状況・決算見込み・計画通り実施できなかった理由】を表記しました。

平成17年度から18年度へ予算を繰り越した事業については、繰越額及び決算見込みを『』書きで表記しています。

なお、「進捗状況」欄の区分は次のとおりです。

- (1) 前倒し実施 →平成19年度以降のスケジュールの一部又は全部を前倒して実施した
- (2) 計画どおり →平成18年度の取り組み目標を達成できた
- (3) 未達成 →平成18年度の計画内容を達成できなかった
- (4) 未着手 →平成18年度に着手しなかった
- (5) 完了・終了 →平成18年度で事業が完了又は終了した

※(3)未達成、または(4)未着手の場合は、「計画通り実施できなかった理由」欄にその理由を記載しています。

注) 実施計画部分の記載内容について（平成18年度～20年度実施計画策定時の内容です。）

- (1) 事業名欄に「**新**」とあるのは、平成18年度以降の新規事業を表しています。
- (2) 事業名欄に「**重〇-△**」とあるのは、重点プロジェクトに位置付けられている事業を表しています。
(例：「重9-1」は「重点プロジェクト9の(1)」のこと ※右図及びP.4参照)
- (3) 事業の区分が他に重複するものについては、事業名に「(再掲あり)」と記載しています。
- (4) 事業費欄の表示は次の内容を示しています。
 - ①平成18年度は当初予算額、平成19・20年度は見込み額
 - ②「-」は、事業費が経常的なもの、または計画事業費のみの算出が困難なもの、未定のものなど
 - ③() 付きの金額は、市の予算を伴わない事業費
 - ④『』付きの金額は、平成17年度から18年度へ繰り越した事業費

<例図>

【開かれた行政と市民参画の推

事務事業名	
重9-1	一層読みや て、掲載 紙の充実
広報誌充実事業	
担当課：秘書広報課	


II 総合計画体系図

【将来都市像】 【基本テーマ(大項目)】

【政策(中項目)】

【(小項目)】

【施策】

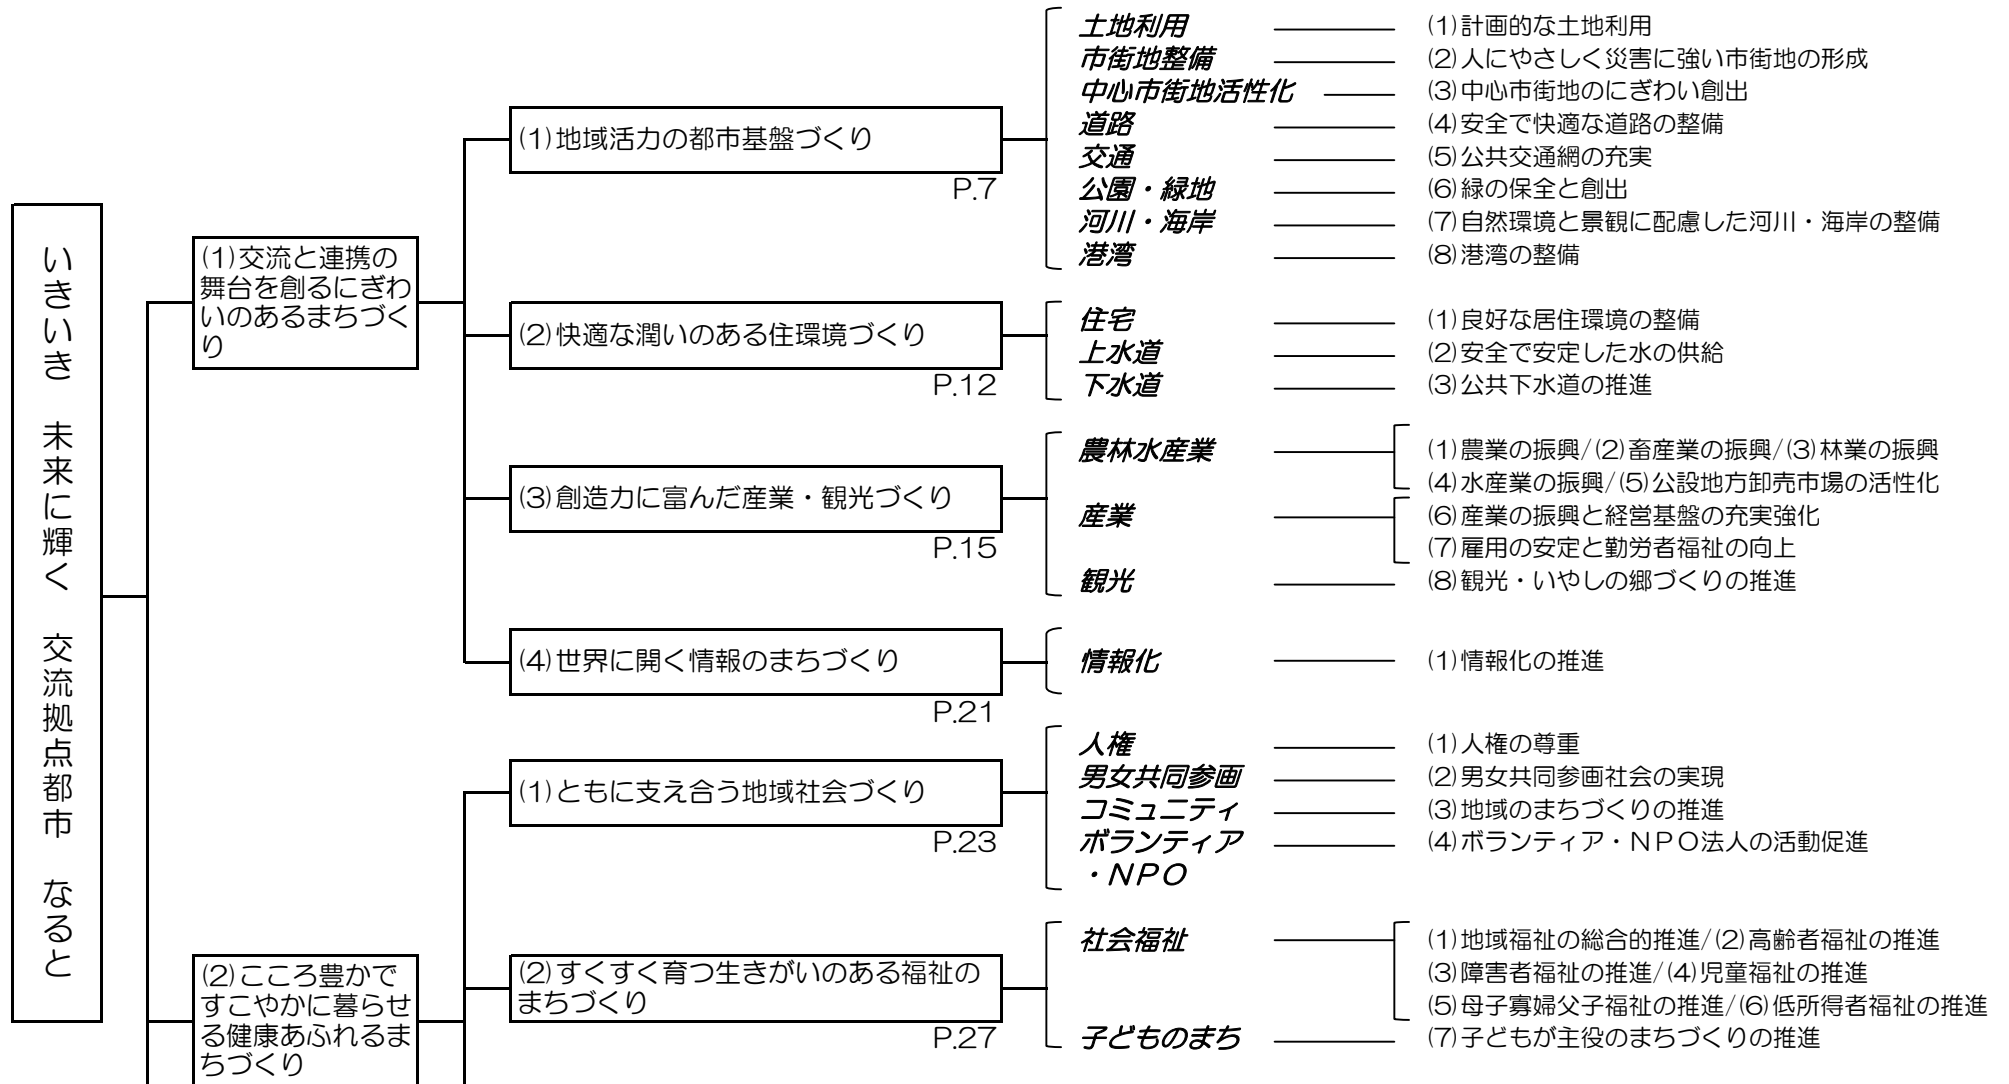

【将来都市像】 【基本テーマ(大項目)】

【政策(中項目)】

【(小項目)】

【施策】



重点プロジェクト（プロジェクト9）

1 夢つなぐ「子どものまち」推進プロジェクト

- (1)子育て支援基盤整備の推進
- (2)子どものまち鳴門プランの推進
- (3)子どもの体験活動・ふれあいの拠点づくり

2 ともに支え合う保健福祉推進プロジェクト

- (1)「健康なると21」の策定と推進
- (2)お元気 SUN ROOM（健康相談プラザ）の設置
- (3)高齢者・障害者支援と社会参加の促進
- (4)地域コミュニティ活動の推進
- (5)ボランティア・NPO活動の推進

3 自然にやさしい環境対策推進プロジェクト

- (1)クリーンセンター建設事業の推進
- (2)最終処分場の確保
- (3)ごみ減量化対策等の推進
- (4)不法投棄対策の推進
- (5)環境諸施策の推進
- (6)火葬場環境整備の推進

4 調和と潤いに満ちた都市創造推進プロジェクト

- (1)都市計画マスタープランの策定
- (2)幹線道路の整備促進
- (3)明神日出線改良事業の推進
- (4)ドイツ村公園の整備推進
- (5)木津城山公園の整備推進
- (6)鳴門ウチノ海総合公園の多面的利用
- (7)公共下水道の整備促進
- (8)合併処理浄化槽整備事業の促進

5 にぎわい創出・まちの活性化プロジェクト

- (1)「ふるーあ鳴門」交流拠点整備の推進
- (2)広域観光対策の推進
- (3)中心市街地活性化対策の推進
- (4)企業誘致の推進
- (5)地産地消の推進
- (6)産直市の活性化
- (7)漁場・漁港環境の整備促進
- (8)地場産品・地場農産物のブランド化の推進

6 未来を拓くひとと文化を育てるプロジェクト

- (1)総合的な教育基本計画の策定と推進
- (2)学校施設・設備の整備促進
- (3)二学期制の導入
- (4)生涯学習・生涯スポーツの推進
- (5)国際・国内交流の推進
- (6)国際交流記念事業の実施
- (7)文化・芸術活動の推進
- (8)大学連携の推進

7 なるとeープラン・情報化推進プロジェクト

- (1)行政情報化の推進
- (2)地域情報化の推進
- (3)広域情報化の推進
- (4)情報通信基盤の整備

8 いのちと財産を守る危機管理プロジェクト

- (1)危機管理・防災意識の醸成と市民防災活動の推進
- (2)危機管理・防災体制の強化と充実
- (3)情報伝達体制の充実
- (4)災害広域応援体制の整備拡充
- (5)公共施設等の耐震化促進
- (6)防災対策の推進
- (7)救急・救命救助高度化の推進

9 時代を切り拓く行財政改革推進プロジェクト

- (1)市民参画による行政の推進
- (2)広域行政の推進と市町村合併の研究
- (3)財政の健全化
- (4)行財政運営システムの構築
- (5)分権を担う人材の育成

Ⅲ 実施計画総括表

(単位：千円)


項 目	平成18年度事業数	平成17年度から18年度への繰越		平成18年度事業費		進捗状況				
		繰越額	決算見込み額	計画額	決算見込み額	前倒し実施	計画どおり	未達成	未着手	完了・終了
1 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり										
(1) 地域活力の都市基盤づくり	15	158,412	158,266	658,671	588,643	1	5	7		
(2) 快適な潤いのある住環境づくり	9	93,002	93,002	1,218,668	941,010		6	1	1	1
(3) 創造力に富んだ産業・観光づくり	18			131,810	123,162		12			5
(4) 世界に開く情報のまちづくり	6			17,995	11,856		1	1	1	3
2 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり										
(1) とともに支え合う地域社会づくり	13			16,760	16,396		13			
(2) すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり	13			68,252	68,707		10	1		1
(3) いきいきと暮らせる健康づくり	6			15,631	13,955		5			1
3 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり										
(1) 循環型の地域環境づくり	13	1,189,692	1,189,692	643,980	826,753	2	8	2		1
(2) いのちを大切にす地域づくり	20			93,805	76,537		13	2	2	3
(3) 安心に包まれた暮らしづくり	3			91,122	39,922		2	1		
4 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり										
(1) たくましい個性あふれるひとづくり	23			82,759	88,822	2	18			3
(2) 文化にふれあう感性豊かなひとづくり	11			47,476	49,326		9			1
5 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり										
(1) 市民と協働する開かれたまちづくり	5			10,226	9,664		5			
(2) 時代を拓く行財政のシステムづくり	7			20,453	18,602		6			1
1 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり	48	251,414	251,268	2,027,144	1,664,671	1	24	9	2	9
2 ところ豊かですこやかに暮らせる健康あふれるまちづくり	32			100,643	99,058		28	1		2
3 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり	36	1,189,692	1,189,692	828,907	943,212	2	23	5	2	4
4 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり	34			130,235	138,148	2	27			4
5 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり	12			30,679	28,266		11			1
合 計	162	1,441,106	1,440,960	3,117,608	2,873,355	5	113	15	4	20

※「再掲」及び「市の予算を伴わない事業」については、事業数に含めているが、事業費には含まれていない。

※平成18年度事業費の「計画額」は、実施計画作成時の事業費である。

IV 実施計画実績

第1章 交流と連携の舞台を創るにぎわいのあるまちづくり
 第1節 地域活力の都市基盤づくり

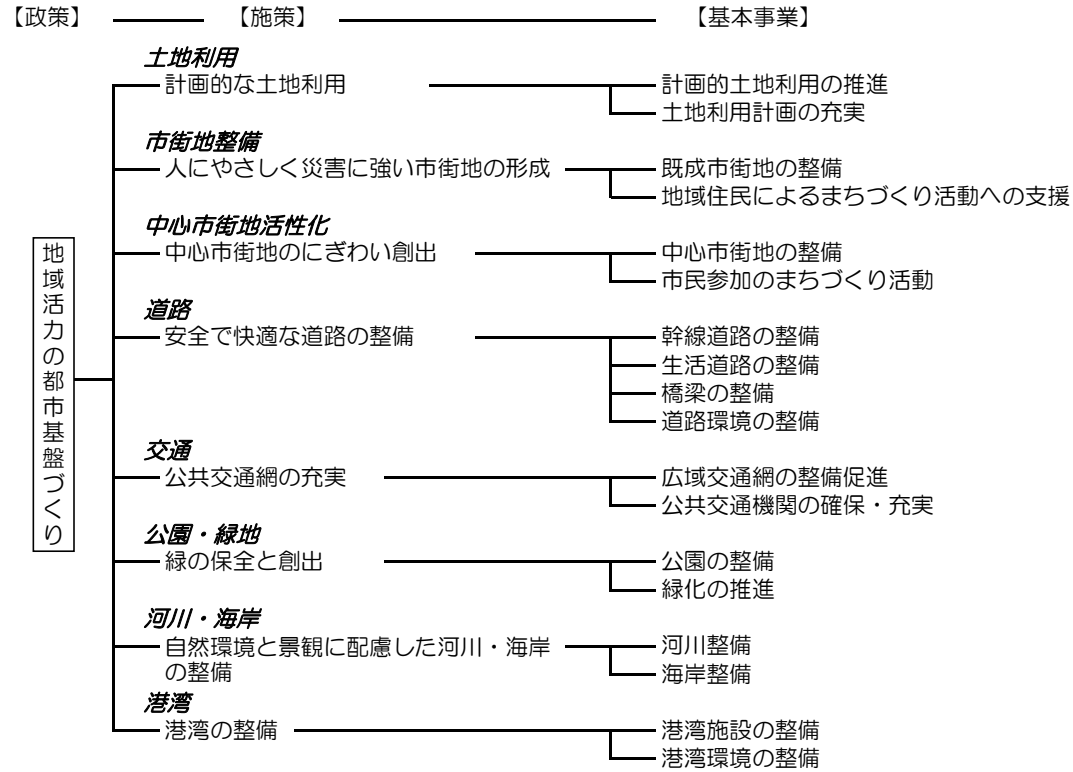

【計画的な土地利用（土地利用計画の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-1 鳴門市都市計画マスタープラン策定事業 担当課：都市住宅課	徳島東部都市計画との整合性を図りながら、都市計画マスタープランの見直しを行う。		調査・検討 7,000	7,600	平成18～20年度の3か年で都市計画基礎調査を実施することとした。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 800	

【中心市街地のにぎわい創出（中心市街地の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-3 中心市街地活性化推進事業 担当課：商工観光課	鳴門市中心市街地活性化基本計画に基づき、本市の特色を活かした中心市街地の活性化を推進し、地元商店街や商工団体等が自主的・主体的に取り組むまちづくりを支援する。	継続 25	20	20	中心市街地活性化法及び都市計画法が平成18年度に改正されたことから、新しい中心市街地活性化基本計画の策定も視野に入れ、情報収集と研究を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 25	
新 重5-3 JR鳴門駅西口整備事業 担当課：商工観光課	JR鳴門駅西口に新たな改札口及びホームまでの通路を整備することで、高齢者や障害者も含め、誰もが安心して利用できるようにするとともに、乗降客の中心商店街への回遊を図る。		設計 5,000	整備 23,000	(平成19年度の実施設計に向けて、関係機関と協議を行った。)	進捗状況 決算見込み	

【安全で快適な道路の整備（幹線道路の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門市道路整備プログラム策定事業 担当課：都市住宅課	都市計画道路整備プログラムを策定する。		調査・検討 6,300	5,700	(鳴門市都市計画マスタープラン策定事業の中へ位置付けることとした。)	進捗状況 決算見込み	

【安全で快適な道路の整備（幹線道路の整備）続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-2 四国横断自動車道周辺対策事業	四国横断自動車道の建設について、各地元対策協議会との設計協議に基づき、周辺整備を順次実施していく。	継続 136,895	200,400	198,700	道路対策4事業、環境対策1事業、県単土地改良1事業の6事業を実施したが、道路対策の1事業については平成19年度に繰り越した。	進捗状況 未達成 決算見込み 84,569	大代的場2号線道路改良工事に係る埋蔵文化財包蔵地の試掘により、土器等の破片が出土し、この発掘調査に日数を要したため繰越をした。
担当課：高速道路対策課							
重4-2 高速道路整備支援事業	13次区間(小松島～鳴門間)において、高速道路の建設に伴い必要な側道等の整備を行う。	継続 『1,333』 98,151	63,900	39,800	<平成17年度からの繰越分> 機能向上側道等に関する調査、測量委託(大幸、段関) <平成18年度分> 大幸、段関、小森地区の側道用地取得を概ね達成	進捗状況 未達成 決算見込み 『1,275』 84,753	小森地区の物件補償1地権者について、移転に日数を要するため、年度内完成に至らず繰越措置をした。
担当課：高速道路対策課							

【安全で快適な道路の整備（生活道路の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-3 明神日出線改良事業	狭あいでの通行に支障をきたしている同市道について、拡幅など改良工事を行う。	継続 『140,089』 212,600	222,000	115,000	<平成17年度からの繰越分> 施行延長L=290m <平成18年度分> 施工延長L=90.0m	進捗状況 未達成 決算見込み 『140,002』 277,704	国費事業については、工事施工に伴う地元住民の協力・理解を得るために不測の日数を要したため、年度内完成に至らず繰越措置をした。
担当課：土木課							
新 木津野松村線改良事業	特に大型車通行量の多い、国道28号から国道11号の間の補修を重点的に進め、通行の安全を図る。	実施 10,000	30,000	42,000	木津野松村線舗装改良工事 施工延長L=60.0m 木津野松村線測量設計業務 業務延長L=1.1Km	進捗状況 未達成 決算見込み 6,920	工事については、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内完成に至らず繰越措置をした。
担当課：土木課							

【公共交通網の充実（公共交通機関の確保・充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
市営バス経営改善事業	運輸事業のあり方について検討し、今後の事業運営の基本的方向性を示すため、18年度に運輸事業基本計画を策定する。				鳴門市運輸事業審議会の設置・開催(5回)、市バス利用者懇談会の開催(14回)、運輸事業に係る庁内連絡調整会議(4回)、市バス利用実態調査の実施、パブリックコメントの実施を経て、運輸事業基本計画を策定した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	
担当課：運輸事業課		継続 -	-	-			

【緑の保全と創出（公園の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-5 木津城山公園整備事業	衛生センター周辺整備事業の一環として、市民の憩いの場としての公園を整備する。				西側斜面広場の階段工・排水工・石張り舗装工を進めた。 施工延長 L=78m 石張り舗装工 274m ² 1.2号階段工 U字溝 L=235m	進捗状況 計画どおり 決算見込み 30,000	
担当課：衛生センター（旧環境政策課）・公園整備事務所		継続 30,000	152,000				
重4-4 ドイツ村公園整備事業	菩提樹の森などドイツ村公園の整備事業を進める。				「菩提樹の森」の植栽エリア造成に必要な南側の池の擁壁等を整備した。	進捗状況 未達成 決算見込み 『12,701』 10,400	工事施工箇所は、現場が狭く、平成17年度繰越分工事と平成18年度現年分工事との同時施行が困難となったため。
担当課：公園整備事務所		継続 『12,702』 30,000	30,000	30,000			
新 重4-4 道の駅「第九の里」整備事業	地域交流の拠点づくりの一環として、ドイツ村公園内に道の駅を整備する。また、道の駅の構内に常設の物産館を開設するとともに、運営、団体の強化、オリジナルブランド、特産品の開発等を行うことにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る。				物産館を整備し、平成18年7月8日、道の駅「第九の里」としてオープンした。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 20,187	
担当課：公園整備事務所		実施 21,000					

【自然環境と景観に配慮した河川・海岸の整備（河川整備）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-6 河川改良事業 担当課：土木課	災害が発生するおそれのある危険な箇所について、緊急性の高いものから改修を順次行う。	継続 2,000	6,000	6,000	西新排水路改良工事 L=15.3m 宮の北排水路改良工事 L=42.0m	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,000	
重8-6 排水機場樋門整備事業 担当課：土木課	老朽化した排水機場のポンプ・発電機などについて、計画的に更新等を行う。	継続 『4,288』 68,000	70,000	70,000	<平成17年度からの繰越分> 林崎第1の6号ポンプ更新 <平成18年度分> 黒崎排水機場改良、弁財天住宅排水機場改良、大桑島排水機場改良、立岩区画排水機場アスベスト対策他	進捗状況 未達成 決算見込み 『4,288』 51,385	大型ポンプは、受注工事製作であり一定の期間を要するが、乾期（冬期）しか工事を実施することが出来ないため、需要が集中し、ポンプ製作に想定以上の工期が必要となり、年度内での完成に至らなかったため。

【自然環境と景観に配慮した河川・海岸の整備（海岸整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 重8-6 室漁港海岸整備事業 担当課：土木課	室漁港海岸の中ケ谷地区及び本村地区の老朽化した既存護岸基礎の補修及び補強を行う。	実施 50,000	継続 20,000	20,000	地質調査 本工事 L=74.0m	進捗状況 未達成 決算見込み 17,900	護岸工事の基礎部の擁壁を水中コンクリートで施工する予定だったが、より安価となるL型ブロックに変更することにした為に積算及び図面の変更等に、不測の日数を要したため。

第2節 快適な潤いのある住環境づくり

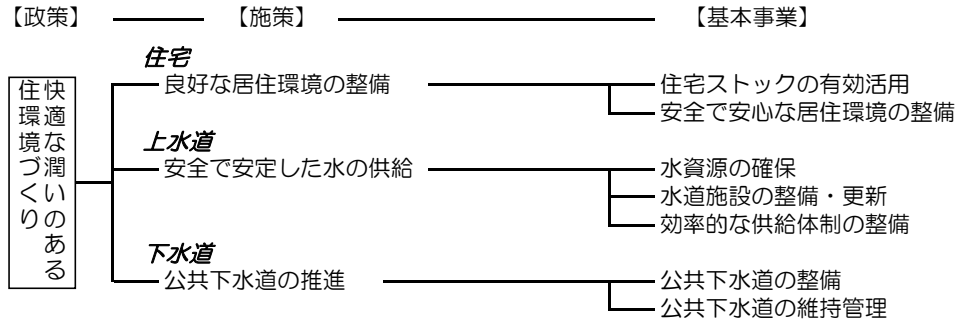

【良好な居住環境の整備（住宅ストックの有効活用）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
市営住宅ストック活用事業 担当課：都市住宅課	鳴門市市営住宅ストック総合活用計画に基づき、年次的・効率的に住環境の改善に努める。				矢倉団地G棟外壁・屋上防水等改修	進捗状況 計画どおり	
		継続				決算見込み 12,753	
		14,247	36,700	36,400			

【良好な居住環境の整備（安全で安心な居住環境の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 市営住宅火災報知器取付事業 担当課：都市住宅課	住宅火災による死者の発生を低減させるため、市営住宅の全団地に計画的・年次的に取り付けていく。				高島団地48戸 桑島団地58戸 明神第二24戸 に火災警報機取付	進捗状況 計画どおり	
		実施	継続			決算見込み 3,666	
		4,102	4,400	3,450			

【良好な居住環境の整備（安全で安心な居住環境の整備） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-5 木造住宅耐震診断支援事業 担当課：都市住宅課	昭和56年の新耐震基準以前の木造住宅について、耐震診断希望者に対し支援を行う。	継続 3,818	15,000	15,000	耐震診断を希望する44戸に対して、支援した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,358	
新 重8-5 木造住宅耐震改修支援事業 担当課：都市住宅課	耐震改修の必要性がある木造住宅に関して補助を行い、住民の生命と財産を守るとともに倒壊による火災の発生防止や避難路の確保を目指す。	実施 3,201	継続 3,200	3,200	5戸の改修支援実施	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,217	
重点密集市街地改良事業 担当課：都市住宅課	全市的な調査を行い重点密集市街地を含む地震災害危険地区を抽出するとともに、住環境の整備目標・整備方針を設定し、現況把握、被害避難の想定、対応方策案の検討を行う。	継続 -	-	-		進捗状況 未着手 決算見込み -	第五次鳴門市総合計画に位置づけ全市的に調査し、改善策や補助制度の調査研究を引き続き行う必要があるため。

【安全で安定した水の供給】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
水道ビジョン策定事業 担当課：水道事業課	水道事業の現状と将来の見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実現のための方策等を示す。	完了 -			今後10年間の長期構想を取りまとめた鳴門市水道ビジョンを策定。	進捗状況 完了・終了 決算見込み -	

【安全で安定した水の供給（水道施設の整備・更新）】

（単位：千円）


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-5 水道施設耐震診断事業 担当課：水道事業課	水道施設の耐震診断を行い、その結果により耐震補強工事などを検討する。18年度は木津ポンプ場の耐震診断を実施する。	継続 3,000	3,000		木津ポンプ場の耐震診断を実施。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,565	

【公共下水道の推進（公共下水道の整備）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-7 旧吉野川流域下水道事業 担当課：下水道課	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、平成21年度の一部供用開始を目標に、流域下水道の整備を促進する。	継続 502,800	541,600	628,800	幹線管渠整備工事、最終処理場地盤改良工事	進捗状況 計画どおり 決算見込み 464,080	
重4-7 公共下水道事業 担当課：下水道課	旧吉野川流域下水道事業の進捗に合わせて、本市内における公共下水道事業を進める。	継続 『93,002』 687,500	830,000	600,000	<平成17年度> 第10工区面整備管築造工事 他 <平成18年度> 第7工区管渠築造工事 他	進捗状況 未達成 決算見込み 『93,002』 454,371	開削工事について、道路に既占用している関係機関との協議に不測の日時を要し、現場によっては水道施設の移設が必要となり、長期の工期を要したため、年度内完成に至らなかった。

第3節 創造力に富んだ産業・観光づくり



【農業の振興（農業の高度化）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-5-6 農水産物直販市開催事業	ウチノ海総合公園において、漁業者・農業者の連携により、本市農水産物の直販を行い、生産者と消費者の顔の見える関係を確立しながら、本市特産物の地産地消の推進と産地育成を図る。	→			ウチノ海総合公園のイベントに併せて開催したり、早朝(7:00～9:00)開催とするなど、試行錯誤しながら4回開催し、述べ6,200人の来場者があった。	進捗状況 計画どおり	
継続	322	-	-	決算見込み 383			
担当課：農林水産課							

【農業の振興（消費者の信頼の確立）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-8 ブランド産地育成事業	本市の風土に特化した農産物を、生産管理システムの活用、PR活動の展開などにより「鳴門ブランド」として確立する。	→			①鳴門ブランド戦略推進会議等の開催。②甘藷、らっきょう、だいこんの各販売検討会、研修会の開催、宣伝販売、先進地視察、パンフレット他PR資料の作成。農業体験等を通して甘藷のPR活動。「鳴門らっきょう」の地域団体商標の出願	進捗状況 計画どおり	
継続	1,790	1,800	1,800	決算見込み 1,420			
担当課：農林水産課							

【農業の振興（農業生産基盤の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
大津東部圃場整備事業	大津東部地区における県営かんがい排水事業の実施により、優良農地の整備・確保を行う。	→			換地計画に基づく換地処分登記完了により全事業完了。	進捗状況 完了・終了	
完了	-			決算見込み -			
担当課：耕地課							

【林業の振興（緑豊かな森林の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳥獣被害対策事業	近年、増加している野生鳥獣からの被害防止策として、捕獲檻や防護柵等の整備を計画的に図ること等により、地域住民の安全な生活と農作物への被害防止体制を確立する。	継続			サル用捕獲檻2基、イノシシ用捕獲檻4基を整備した。竹ノ下地区、川筋地区においてイノシシ防護用電気柵整備に補助金を交付した。また、大浦地区において、サル被害対策研修等のモデル事業を行った。	進捗状況	
		2,948	3,180	3,180		計画どおり	
担当課：農林水産課						決算見込み	

【水産業の振興（漁業生産基盤の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-7 漁場環境保全創造事業	漁業環境の悪化や水産資源の枯渇による漁獲高の減少対策として、掃海事業を実施し、漁業機能の回復に努める。	継続			徳島北部底曳き網協会所属97隻により、播磨灘沖で10.5km ² を漁具を使って79m ² 海底沈殿物を除去し、処分を行った。	進捗状況	
担当課：農林水産課		4,407	4,400	4,400		計画どおり	
						決算見込み	
重5-7 大浦地区地域水産物供給基盤整備事業	平成元年度に着手後、北防波堤、東護岸、東防波堤等の整備を進めてきた。北防波堤高上げ工事を完成させる。	完了			北防波堤 L=5.5m	進捗状況	
担当課：土木課		50,000				完了・終了	
						決算見込み	
新 重5-7 撫佐漁港整備事業	漁村環境の改善並びに漁港機能の充実を図るため、護岸及び防波堤の整備を行う。	実施	継続		公有水面埋立申請書作成、地質調査、測量設計等を行った。	進捗状況	
担当課：土木課		32,000	75,000	75,000		計画どおり	
						決算見込み	

【産業の振興と経営基盤の充実強化（地場産業の育成・振興）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-8 伝統的工芸品産業振興事業 担当課：商工観光課	平成15年9月に国の伝統的工芸品に指定された大谷焼について、伝統的な技術・技法の保護に努め、大谷焼陶業協会とともに振興計画を推進し、県外での展示会を実施するなどして振興を図る。	900	800	700	東京池袋の全国伝統的工芸品センターにおいて、6月1日から13日まで「阿波の焼物 大谷焼展」を開催し、普及、宣伝に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 900	

【産業の振興と経営基盤の充実強化（企業誘致の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-4 企業誘致推進事業 担当課：商工観光課	県との連携等により県内外の優良企業を「なるとソフトノミックスパーク」などへ誘致し、就業機会の増大や地域経済の活性化、市民所得の向上など、活力ある街づくりを推進する。	616	1,150	1,150	「なるとソフトノミックスパーク」において、賃貸契約で立地していた1社と土地売買契約を締結。「鳴門複合産業団地」では鳴門市所有の1区画を含む5区画で売買が成立し化学工業2社の進出が決定した。その他、大麻町に半導体企業1社が進出した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 356	

【雇用の安定と勤労者福祉の向上（就業機会の拡大）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門地域雇用機会増大促進支援事業 担当課：商工観光課	本市と板野郡4町（藍住町、板野町、北島町、松茂町）の雇用機会の創出を目的に設立された、鳴門地域雇用機会増大促進支援協議会の活動を支援することにより、本市における雇用の増大を図る。	終了 -			(財)高年齢者雇用開発協会より委託を受けた鳴門地域雇用機会増大促進支援協議会が、雇用増大のための4事業を行い、市は当協議会活動への支援を行った。各事業とも周知が広まり雇用創出82名の成果を得た。	進捗状況 完了・終了 決算見込み (24,545)	

【観光・いやしの郷づくりの推進（観光基盤の整備・活用）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重5-1</p> <p>ふるーあ鳴門交流拠点整備事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>高速鳴門バス停留所及び周辺エリア（ふるーあ鳴門）の機能充実と環境整備の検討を進め、本州と四国を結び交流拠点としてのハブターミナル化を目指す。</p>	<p>継続</p> <p>6,000</p>	<p>44,000</p>	<p>—</p>	<p>高速鳴門バス停施設のバリアフリー化率100%を目標に、上り車線入口にエレベーターを設置するための実施設計を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>4,410</p>	
<p>新</p> <p>観光周遊バス社会実験事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>観光客が公共交通機関を利用して、市内の観光地を自由に往来できるよう、「ふるーあ鳴門」を起点に、鳴門公園と市西部（大麻町）を周遊バスで結ぶ社会実験を行い、観光客の移動手段の確保と交通環境の整備を図る。</p>	<p>実施</p> <p>10,000</p>			<p>平成18年4月～10月の間、鳴門公園～板東の間で周遊バス運行の社会実験を実施した。（運行回数7回/日×183日）</p>	<p>進捗状況</p> <p>完了・終了</p> <p>決算見込み</p> <p>10,000</p>	
<p>新</p> <p>レンタサイクル事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>市西部の観光拠点としてサイクリングコースを設定するとともに、レンタサイクルの整備を進めることにより、交流人口や滞留時間の増加を図り、賑わいを創出する。</p>			<p>実施</p> <p>4,000</p>	<p>（まちづくり交付金事業計画に平成20年度事業として位置付けた。）</p>	<p>進捗状況</p> <p>決算見込み</p>	

【観光・いやしの郷づくりの推進（観光客の誘致促進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重5-2</p> <p>瀬戸内四都市広域観光推進事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>神戸市、倉敷市、琴平町及び本市の四都市が手を結び、魅力の高い広域の周遊ルートを設定し、訪日外客を含む全国からの観光客を対象とした、共同による広域観光誘致事業を実施し、圏域への観光客の誘致を図る。</p>	<p>継続</p> <p>2,043</p>	<p>2,040</p>	<p>2,040</p>	<p>平成18年8月、中国の旅行者、マスコミ等を招聘し、瀬戸内クルーズモニターツアー・ファミトリップを実施した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>2,058</p>	
<p>重5-2</p> <p>観光情報センター管理運営事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>高速鳴門バス停留所をより使いやすくするとともに、市内や県内の観光案内のほか四国の主要観光地の紹介を行うなど、四国の東玄関口にふさわしい観光の拠点施設として管理運営を行う。</p>	<p>継続</p> <p>13,209</p>	<p>13,200</p>	<p>13,200</p>	<p>観光情報センター管理運営に指定管理者制度を導入し、より効率的な管理運営を行ったほか、観光案内及び観光情報端末により観光客への情報提供を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>12,875</p>	


【観光・いやしの郷づくりの推進（観光客の誘致促進） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重5-2 コンベンション誘致支援事業 担当課：商工観光課	市内宿泊を伴う会議や学会、スポーツ大会などのコンベンションを対象に開催支援助成金を交付し、市内への流入人口増及び地域経済の活性化を促進する。	継続 600	1,100	1,100	鳴門市観光コンベンション(株)を窓口として、スポーツ大会や会議の誘致に努め、14件のコンベンション開催支援助成を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 910	
新 「バルトの楽園」ロケセット活用事業 担当課：商工観光課	映画「バルトの楽園」のロケセットの一般公開を行い新たな観光資源として活用を図り、観光客増による地域の活性化を目指す。	実施 2,975	継続 25,000		平成18年3月21日のオープンから平成19年3月末までに、有料入場者通算185,354人を達成した。また「宝くじ助成」によりマイクロバスを購入し、板東駅～ロケ村間で来客の無料送迎を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 10,072	
新 観光ビジョン策定事業 担当課：商工観光課	観光関連産業はもとより地域の活性化を図るため、鳴門観光の長期ビジョンを市観光協会とともに策定し、国内外からの観光客誘致を促進する。	実施 4,000			平成19年3月に鳴門市観光振興計画策定をした	進捗状況 完了・終了 決算見込み 4,000	

第4節 世界に開く情報のまちづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____



【情報化の推進（電子自治体の実現）】

（単位：千円）


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重7-1</p> <p>総合文書管理システム構築事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>行政事務の効率化・高度化や経費節減、ペーパーレスの推進、情報開示への対応等を実現していくために文書管理システムの導入を図る。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>県と市町村でつくる徳島県・市町村情報化推進協議会で、電子自治体共同システムの構築を共同アウトソーシングにより進めており、文書管理システム導入への課題の整理・検討を進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>未達成</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	<p>共同開発による文書管理システムの開発が遅れており、本市の導入について検討することができなかった。</p>
<p>重7-1</p> <p>電子申請等共同受付システム構築事業</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>市民に対する行政サービスの向上と、行政事務の効率化・高度化のため、24時間、365日、オンラインで申請・届出の手續が可能となる電子申請・届出システムを構築する。</p>	<p>継続</p> <p>2,771</p>	<p>2,700</p>	<p>—</p>	<p>文書管理システムと同様に徳島県・市町村情報化推進協議会で共同アウトソーシングにより進めている。現在運用が開始されている30手續きのうち、犬の登録関係などの8手續きはそれぞれ運用を開始しており、残りの手續きの運用について検討を進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,719</p>	
<p>重7-1</p> <p>電子入札導入事業</p> <p>担当課：契約管財課</p>	<p>公共工事の受発注手續の透明性を高め、また公正な競争を促進しコストを縮減するために電子入札制度を導入・運用する。</p>	<p>導入検討</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>		<p>進捗状況</p> <p>未着手</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	<p>昨年度の県・市町村情報推進化専門部会作業部会において、開発費・運用費の負担割合等についての最終提案が取りまとめられた。現在導入している契約管理システムの更新・連携等も視野に入れた上で、導入について検討を進めていく。</p>
<p>重7-1</p> <p>公有財産管理システム構築事業</p> <p>担当課：契約管財課</p>	<p>法定外公共物管理システムをベースに構築された財産管理システムを活用し、市有財産の一元管理を進める。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>管財管理の公有財産異動簿と固定資産土地台帳について確認・調査を行い、253筆について公有財産管理システムへ入力処理を行った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>完了・終了</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	

【情報化の推進（電子自治体の実現） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重7-1 市ホームページ整備・拡充事業	市民生活に必要な最新の情報を提供できる環境の整備を行い、1課1ホームページの作成・運用、携帯電話にも対応した災害情報の提供などを進める。	→	→	→	市民に最新の情報や災害情報などを提供できる環境を整備した。	進捗状況	
	継続					完了・終了	
担当課：情報化推進室（旧情報システム室）		—	—	—		決算見込み	
						—	
重7-4 庁内LAN・情報機器整備事業	意思決定の迅速化や業務改善、事務処理の効率化を図るため、庁内LANの強化・充実と職員一人1台のパソコン整備を進める。	→	→	→	庁内LANの充実、職員一人1台のパソコンの整備はほぼ達成された。 今後は、継続的にLANの強化やパソコンの更新を行っていく。	進捗状況	
	継続					完了・終了	
担当課：情報化推進室（旧情報システム室）		15,224	16,000	12,900		決算見込み	10,137

第2章 ころ豊かですやかに暮らせる健康あふれるまちづくり
 第1節 ともに支え合う地域社会づくり



【人権の尊重（人権行政の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績	
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権文化祭開催事業	幼稚園、小・中・高等学校、行政及び市民による人権問題に関する作品の展示などを通じて、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するため開催する。				11月11日(土)～19日(日)人権福祉センター等において、あらゆる人権が尊重されるまちづくりを推進するために、幼・小・中・高・行政及び市民による人権問題に関する作品を展示し、啓発に努めた。来館者数 7,678人(前年比 7.4%増)	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,071
担当課：人権福祉センター		継続 1,118	1,110	1,110		

【人権の尊重（人権意識の高揚）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権セミナー開催事業	「人権」に関して理解と認識を深め、人権意識を高めることを目的に開催する。	継続			「新たな人権」を研修課題に、7/8～7/29の各土曜日に4回開催し、広く一般市民へ啓発することにより人権に対する意識改革を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 209	
担当課：人権推進課		209	200	200			
人権地域フォーラム開催事業	一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深め、人権尊重のまちづくりを推進するため、本市と板野郡5町の共催でフォーラムを開催する。	継続			鳴門市と板野郡5町が共催で、「ひとごと」から「わがこと」へ一自己をみつめ、人と人がつながる人権学習」をテーマにパネルディスカッション方式で広域的な人権研修を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 302	
担当課：人権教育課		358	350	350			
啓発資料「わたしたちの人権問題」全戸配布事業	人権問題を身近な問題と捉えてその解決に向けて主体的に取り組む市民を育成するため、身近な人権問題の資料を作成し、啓発資料として市内全戸に配布を行う。	継続			人権問題の啓発資料としてリーフレット（「わたしたちの人権問題」No.36）を26,000部作成し、市内全戸に配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 688	
担当課：人権教育課		750	750	750			

【人権の尊重（人権教育）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
人権教育研究大会開催事業	これまでの同和教育・啓発の手法を生かしながら、本市における人権教育・啓発を構築、実践する大会として継続していく。	継続			第一中学校校区内の幼・小・中学校と里浦ちどり保育所で研究大会を開催するとともに、大会誌を作成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 659	
担当課：人権教育課		718	710	710			
鳴門市人権推進協議会支援事業	本市における社会人権教育推進の中核をなす鳴門市人権教育推進協議会の活動への支援を継続して行う。	継続			市人権教育推進協議会が実施する人権地域フォーラム・人権教育研究大会、ヒューマンライツメッセージなど、街頭啓発、各種研修会、企業が参加している県外研修視察等の活動を支援し、本市における人権教育・啓発の推進を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,620	
担当課：人権教育課		1,620	1,620	1,620			

【男女共同参画社会の実現（あらゆる分野への男女共同参画の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
男女共同参画リーダー養成講座開催事業	男女共同参画社会の実現に向けて活動を推進するリーダーを養成するために開催する。	継続			男女共同参画リーダー養成講座を1/24・31に2回開催し、男女共同参画社会実現に向けて活動を推進するリーダーを養成するため開催した。	進捗状況	
担当課：人権推進課		94	90	90		計画どおり	
					決算見込み	22	
男女共生セミナー開催事業	現在の女性と男性を取り巻く諸問題をはじめ、女性問題や男性問題について幅広い角度から学習することにより、男女共生についての理解と認識を深め、共に男女共同参画社会実現を目指すことを目的に開催する。	継続			男女共生セミナーを9/9・16に2回開催し、男女共生についての理解と認識を深め、共に男女共同参画社会実現に向け開催した。	進捗状況	
担当課：人権推進課		107	100	100		計画どおり	
					決算見込み	107	

【男女共同参画社会の実現（男女が共に自立した生き方を支える福祉の充実と健康の増進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
女性相談事業	男女共同参画社会実現のため、女性に対する偏見や差別意識、人権侵害により苦しむ女性を擁護・救済することを目的に実施する。	継続			女性であるがゆえの差別や人権侵害、さらに自己の能力を十分発揮できない環境で苦しむ女性のために、月1回（平成18年度は12回+1回）第2水曜日13:00～16:00まで本庁1階相談室でカウンセリングを実施した。	進捗状況	
担当課：人権推進課		207	200	200		計画どおり	
					決算見込み	207	

【地域のまちづくりの推進（コミュニティ活動の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 コミュニティ活動活性化事業	地区自治振興会の機能の強化を図るため、活動支援助成を行うとともに、自治振興会と協働してコミュニティ活動の活発化を図り、まちづくりを推進する。	継続			地区自治振興会の機能の強化を図るため、活動支援助成を行うとともに、自治振興会と協働してコミュニティ活動の活発化を図り、まちづくりを推進した。	進捗状況	
担当課：市民活動推進課		4,340	4,340	4,340		計画どおり	
					決算見込み	4,340	

【地域のまちづくりの推進（コミュニティ活動の推進） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 コミュニティ助成事業 担当課：市民活動推進課	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の伝承文化を次世代に伝え、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、コミュニティ団体に対し助成する。	継続 5,000	5,000	5,000	地域の伝承文化の継承、地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、(財)自治総合センターの助成事業を活用して、市内の2団体に対し助成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,000	

【地域のまちづくりの推進（地域づくり活動の支援）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-4 地域づくり支援事業 担当課：市民活動推進課	地区自治振興会を単位として、市民自らの手による独自の地域づくりを支援する。	継続 732	730	730	市民自らの手による独自の地域づくりに取り組む9地区の自治振興会に対し支援した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 732	


【ボランティア・NPO法人の活動促進（NPO法人の活動促進）】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-5 市民活動支援センター事業 担当課：市民活動推進課	鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例に則し、活動団体に情報提供や活動の場を確保し、ネットワーク化を促進する。また、活動団体相互の連携、行政との協働を図る。	継続 1,507	1,500	1,500	市民活動専任指導員によるNPOに関する相談事業を実施するほか、情報機関紙発行の充実や交流研修会の開催等によりネットワーク化を推進するなど社会貢献活動を支援した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,439	

第2節 すくすく育つ生きがいのある福祉のまちづくり

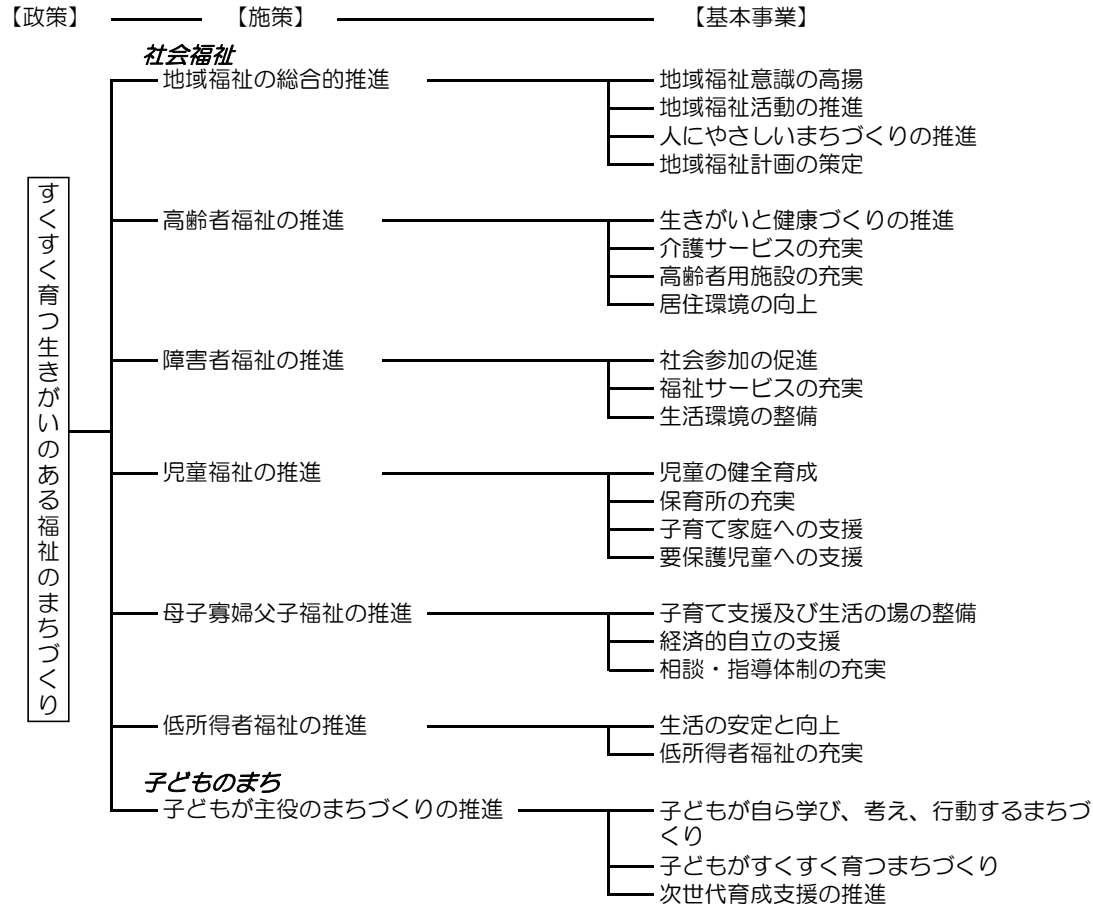

【地域福祉の総合的推進（地域福祉計画の策定）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
地域福祉計画策定事業	すべての市民が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送れるよう、地域社会の様々な力を活用しながら、福祉サービスを総合的に提供する仕組みを作り上げるため、「地域福祉計画」を策定する。		→		（「障害者計画・障害福祉計画」のサービスプラン等を考慮して策定することとした。）	進捗状況	
担当課：高齢障害福祉課			実施	1,750		決算見込み	

【高齢者福祉の推進（生きがいと健康づくりの推進）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
敬老の日のお祝い開催事業	長寿を祝うとともに、高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりを目的に「敬老の日のお祝い」を開催する。			→	敬老の日にお祝い（金婚・ダイヤモンド婚の該当者に記念品贈呈、優秀敬老作文の表彰と朗読発表、芸能大会）を開催するとともに、お祝いに関する意向調査を実施した。	進捗状況	
担当課：高齢障害福祉課		継続	1,018	1,010		1,010	計画どおり 決算見込み 970

【障害者福祉の推進】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 障害者計画及び障害福祉計画策定事業	ノーマライゼーションの理念に基づき、本市における障害者の自立と社会参加の促進を図る「障害者計画及び障害福祉計画」を策定する。		→		鳴門市障害者福祉計画策定委員会を5回開催し、障害者計画・障害福祉計画を策定した。	進捗状況	
担当課：高齢障害福祉課		実施	2,700			完了・終了 決算見込み 2,267	

【障害者福祉の推進（社会参加の促進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重2-3 コミュニケーション支援事業 担当課：高齢障害福祉課	聴覚障害者（児）一人ひとりに応じた情報やコミュニケーションを確保するため、手話通訳者による、コミュニケーション支援、情報提供支援、相談及び生活支援等を行う。	継続 2,780	2,780	2,780	障害者の社会参加を促進するため、手話通訳者設置事業、手話通訳者・手話奉仕員派遣事業を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,396	

【児童福祉の推進（児童の健全育成）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 放課後児童健全育成事業 担当課：児童福祉課	仕事等で昼間保護者のいない小学校低学年児童を対象に、市内11か所の児童クラブにより、学校の余裕教室や児童館等において実施されている放課後健全育成事業を支援する。（平成18年度から12か所の予定）	継続 48,499	41,550	41,550	学校の余裕教室や児童館等において、小学校児童（1年生～6年生）を対象に事業を実施した。登録児童数は毎年増加している。	進捗状況 未達成 決算見込み 49,201	平成18年度内に1箇所が開設する予定であったが、準備の遅れから、平成19年4月よりの事業実施となった。

【児童福祉の推進（保育所の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
公立保育所再編事業 担当課：児童福祉課	保育サービスの充実や効率的な行政運営を進める観点から、保育所の民間移管や統廃合を行い、公立保育所を再編する。（平成18年度に2保育所、平成19年度に2保育所を民間移管予定）	実施 84	継続 -	-	2保育所(木津・堀江)が民間移管となり、5月に三者協議会（事業者・保護者・行政）を開催し、保育内容等について確認した。平成19年度2保育所の民間移管に向けて、三者協議会を4回開催するとともに、環境整備を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 84	
新 保育士リーダー養成講座開催事業 担当課：児童福祉課	保育サービスの質の向上を図ることを目的として、公立・市立保育所の保育士等を対象に必要な知識の習得や資質の向上を図るための研修を実施する。	実施 80	継続 80	80	市内公私立保育所より15名の保育士が参加し、年間6回実施した。課題とする4つのテーマに沿ってグループ研修に取り組むとともに、この成果を冊子としてまとめた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 80	

【児童福祉の推進（子育て家庭への支援）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-1 ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンターを通して、地域の子育て相互援助活動を支援する。				広報など等で会員募集を行い、平成17年度末に93人であった会員数が、平成18年度末には156人と着実に増加している。それに伴い活動件数も202件から820件へと大幅に増加した。	進捗状況	
				計画どおり			
担当課：児童福祉課		継続			決算見込み	9,632	
		9,632	9,630	9,630			

【子どもが主役のまちづくりの推進（子どもが自ら学び、考え、行動するまちづくり）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 のびのびパスポート事業	子どもたちの健全育成と教育環境の充実のため、神戸市及び神戸隣接6市2町、淡路島3市1町、鳴門市、徳島市の広域事業として、小中学生を対象に地域内にある教育関係施設等を無料で開放する「のびのびパスポート」を発行する。				平成19年度版のびのびパスポート（小学生用3600部、中学生用1800部）を作成した。※平成19年4月に全小中学生に配布した。	進捗状況	
				計画どおり			
担当課：企画調整課（旧企画情報課）		継続			決算見込み	43	
		150	150	150			
重1-2 なると再発見子どもバス事業	市内の自然・文化・歴史の関係施設見学等を通じて、鳴門市を再認識してもらうとともに、子どもの意見等を行政に反映し、子どものまちづくりの推進を図る。				映画「バルトの楽園」のロケ村や周辺の鳴門の海の自然環境を考えるために徳島県立水産研究所鳴門庁舎などを見学した。子どものまちづくりに子どもたちの意見を反映させるためアンケートを実施した。	進捗状況	
						計画どおり	
担当課：文化交流推進課		継続			決算見込み	114	
		128	120	120			

【子どもが主役のまちづくりの推進（子どもがすくすく育つまちづくり）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 子どもホリデーフリーパス事業	小学生を対象にして、学校が休みの日に市営バスを利用して市内を自由に散策し、様々な体験活動を通じて、自主性・積極性が育つよう、側面から支援する。				本事業を啓発するとともに利用者増を図るため、年4回のN*CAP参加者が利用したほか、「子どものまちフェスティバル」には会場まで市バスの臨時便を運行した。平成18年度1,391名が利用した。	進捗状況	
						計画どおり	
担当課：文化交流推進課		継続			決算見込み	810	
		810	810	810			

【子どもが主役のまちづくりの推進（子どもがすくすく育つまちづくり） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 子どものまちづくり推進事業 担当課：文化交流推進課	子どものまち宣言の趣旨に沿い、「地域で子どもを育てる」という視点に立つまちづくりを目指して、市民みんなが「子どものまちづくり」について考える機会をつくる。	継続 56	130	130	子どものまちづくり市民のつどいとして「宝くじふるさとワクワクシアターin鳴門」を開催した。また子どものまちづくり推進協議会主催の「第4回子どものまちフェスティバル」は市民延べ7,000人が参加した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 138	
重1-3-4-6 鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業 担当課：公園整備事務所	体験学習や親子・友だち同士で気軽に参加できるふれあいイベント、軽スポーツイベントなどの活用を推進する。	継続 2,315	2,310	3,360	U-10フットサル交流大会・児童画コンクール・ウチノ海総合公園鳴門のまつり・子どもフェスティバル・季節イベントを実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,972	

第3節 いきいきと暮らせる健康づくり



【健康・医療対策の推進（「健康なると21」の策定及び推進）】

（単位：千円）

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績	
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 重2-1 食ネットワーク事業 担当課：健康企画室	教育・福祉・保健の関係機関が連携する「食のネットワーク会議」を活用し、市民の健康増進や生活習慣病予防のため、乳幼児期から適正な生活習慣を身につけることができるよう、「食」を通じて健康づくりを支援する。	実施 80	継続 80	80	食のネットワーク会議を2回、実務担当者会を6回、夏休み親子ヘルシークッキングを2回、出前講座を5回開催し、食ネット通信を2回発行した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 82
新 重2-1 親子体操教室開催事業 担当課：健康企画室	親子で体を動かすことの楽しさや大切さを学んで、生活習慣病の要因である肥満を幼児期から予防するため、親子体操教室を開催する。	実施 180	継続 180	180	親子体操教室を6回開催 ※参加者 親子20組	進捗状況 計画どおり 決算見込み 79

【健康・医療対策の推進（「健康なると21」の策定及び推進） 続き】

(単位：千円)

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(新) (重2-1) のびのび遊ぼうマップ作成事業 担当課：健康企画室	生活習慣病の要因である肥満を幼児期から予防するため、親子で運動をする場や交流の場、さらに医療機関などを含め健康に関する情報提供等を分かりやすくまとめたマップを作成する。	実施 210			2,000部作成配布	進捗状況 完了・終了 決算見込み 199	

【健康・医療対策の推進（健康意識の高揚と保健予防活動の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
フッ化物塗布推進事業 担当課：健康企画室	虫歯予防の意識付けのため、1歳6か月期での歯科検診後に、希望幼児に対しフッ化物の塗布を行う。	継続 560	560	560	対象者431名 受診者217名	進捗状況 計画どおり 決算見込み 327	

【健康・医療対策の推進（健康相談機能の充実）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重2-2) お元気 SUN ROOM 運営事業 担当課：健康企画室	広く市民の健康についての相談窓口として常設し、乳幼児から高齢者までの健康や食事に対する悩み相談を受け、市民の健康増進に努める。	継続 143	140	140	開所日数 247日 利用延べ人員 3,314名	進捗状況 計画どおり 決算見込み 143	

【国民健康保険の推進（健全財政の確立）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
国民健康保険料収納率向上特別対策事業 担当課：保険課	保険料収納率の向上のため、嘱託収納員による定期的な臨戸徴収などさまざまな対策を進める。			→	嘱託収納員により臨戸徴収に取り組んだ。また、滞納システムに短期・資格者証該当者の抽出管理機能の追加を行い、より詳細な対応ができるよう努めた。	進捗状況 計画どおり	
		継続 14,458	10,000	10,000		決算見込み 13,125	

第3章 安全と安心に包まれた快適な環境のまちづくり
 第1節 循環型の地域環境づくり

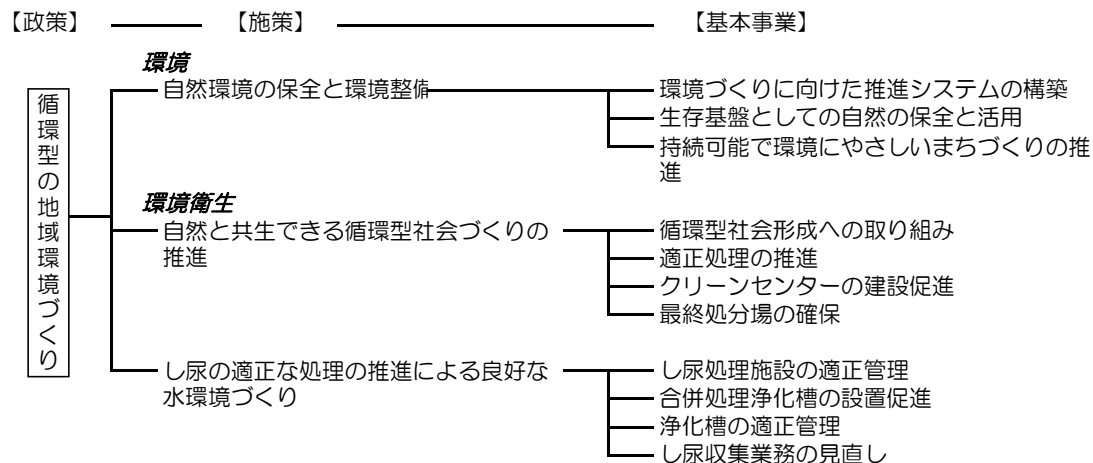

【自然環境の保全と環境整備（環境づくりに向けた推進システムの構築）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-5 「なると環境スクール」 認定事業	市内の小中学校を対象に、環境にやさしい学校づくりに向けたシステムを構築している学校を「なると環境スクール」として認定し、子どもたちの環境教育を進め、自然環境やごみ問題等について正しく理解し、高い環境意識を持つ人材の育成を図る。				認定スクールの実施に向けた具体的取り組みの協議を継続して教育委員会と行った。	進捗状況	教育委員会との協議のなかで、今後も実施方法等について継続した協議が必要である。
担当課：環境政策課・学校教育課	検討協議	—	—	—		未達成	
						決算見込み	

【自然環境の保全と環境整備（持続可能で環境にやさしいまちづくりの推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-3 「フクロウと子どもたちの森」づくり推進事業	瀬戸町浦代の森を人と自然の共生空間として、クリーンセンター施設及びその周辺で子どもたちや市民が憩える場づくりを進める。				これまでの聴取したの意見をもとに、フクロウと子どもたちの森整備基本計画を策定した。	進捗状況	
				計画どおり			
		計画設計 2,900	実施 50,000	-	決算見込み 2,415		
担当課：環境政策課							

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（循環型社会形成への取り組み）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-3 分別収集対策事業	廃棄物減量等推進員を配置し、地域におけるごみ減量を推進する。				市内各地区に廃棄物減量等推進員を配置し、市民の分別指導、啓発を行なった。また、廃棄物減量等推進員会議を3回開催し、推進員を通じて地域におけるごみ減量、リサイクルをお願いした。	進捗状況	
				計画どおり			
		継続 8,103	8,180	8,100	決算見込み 8,082		
重3-3 資源ごみ対策事業	報奨金制度を有効的に活用し、資源ごみの回収を促進する。				回収量 可燃系（紙類） 3,462 t 不燃系 362 t 合計 3,824 t 平成18年度より、新たに雑がみを対象に追加した。	進捗状況	
				計画どおり			
		継続 36,931	36,930	36,930	決算見込み 33,077		
重3-3 生ごみ減量対策事業	生ごみ処理機等の設置支援を行うことによって、家庭での生ごみ処理を推進し、生ごみの減量を図る。				家庭での生ごみ処理を推進するため、電気式生ごみ処理機47機、コンポスト58器、EM密閉容器237器の設置支援を行った。	進捗状況	
				計画どおり			
		継続 4,871	4,870	4,870	決算見込み 2,711		
重3-3 指定ごみ袋事業	指定ごみ袋制度によって、排出者が排出量に応じた費用を負担することにより、公平性を図るとともに、ごみ減量の意識、ごみ分別の意識を高める。				平成18年度より、発注方法を見直し、指定ごみ袋製造及び納入委託にかかる費用の削減に努めた。	進捗状況	
				計画どおり			
		継続 39,372	39,370	39,370	決算見込み 33,911		
担当課：廃棄物対策課（旧環境政策課）							

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（循環型社会形成への取り組み） 続き】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-3 ごみ減量啓発事業	ポスターコンクールの開催、PR誌の作成等によりごみ減量の啓発を図る。	継続			小学4年生を対象に社会科副読本の配布とポスターコンクールを実施。広報別冊「市民とごみ」を全戸配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 788	
担当課：廃棄物対策課（旧環境政策課）		940	940	940			
新 重3-5 鳴門エコライフ制度事業	鳴門市版環境家計簿を作成し、各家庭におけるごみ量、エネルギー消費に伴うCO2排出量の現状を把握してもらうとともに、目標を設定して減量への取り組みを促進する。	実施	継続		登録世帯数・登録店舗数を増やすように努め、エコファミリー登録世帯数が458世帯、エコショップ登録店舗数が6店舗となった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 344	
担当課：廃棄物対策課（旧環境政策課）		541	1,650	1,650			

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（適正処理の推進）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-4 不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	廃棄物の不適正処理の発見、未然防止のため、地域住民による監視体制を組織化し、不適正処理の監視、行為者及び状況の情報収集を行う。	継続			平成18年度は北灘地区と鳴門西地区に設置。不法投棄物の除去、及び監視活動を実施。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 530	
担当課：廃棄物対策課（旧環境政策課）		286	280	280			

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（クリーンセンターの建設促進）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-1 クリーンセンター建設事業	周辺環境への十分な配慮と、地域住民の理解や関係機関等の協力を得ながら、最終発生物もリサイクル可能となる循環型社会に適応した新ごみ焼却施設の整備を図る。	継続 『1,180,986』			<平成17年度からの繰り越し分> 新ごみ焼却施設に係るプラント機器の工場製作や造成工事、進入路工事等を実施した。 <平成18年度分及び前倒し分> プラント機器の工場製作(前倒し分含む)や建物本体の基礎工事等を実施した。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 『1,180,986』 486,164	
担当課：クリーンセンター建設推進局		391,967	1,630,600				

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（クリーンセンターの建設促進）続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-1 リサイクルプラザ整備事業 担当課：クリーンセンター建設推進局	周辺環境への十分な配慮と、地域住民の理解や関係機関等の協力を得ながら、リサイクルプラザの整備を図る。	継続 133,000	→ 926,100		リサイクルプラザ施設に係るプラント機器の工場製作及び建物本体の基礎工事等を実施した。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 242,200	

【自然と共生できる循環型社会づくりの推進（最終処分場の確保）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-2 徳島東部臨海処分場対策 参画事業 担当課：環境政策課	不燃ごみ等の最終処分場を確保するため、松茂町沖の徳島東部臨海処分場の整備を促進する。	継続 70	→		周辺対策にかかる負担金の清算が終了。徳島東部臨海処分場対策協議会が解散された。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 0	

【し尿の適正な処理の推進による良好な水環境づくり（合併処理浄化槽の設置促進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重4-8 合併処理浄化槽設置整備 事業 担当課：環境政策課	河川・排水路の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の整備を計画的に推進する。	継続 『8,706』 24,999	→ 24,900	→ 24,900	補助基数 5人槽 62基（14基） 6～7人槽 76基（28基） 8～10人槽 6基（2基） 計144基（44基） ※「()」内の数値は、うち平成17年度からの繰越分の数	進捗状況 未達成 決算見込み 『8,706』 16,531	工事の工期が延び、平成18年度内に設置を完了できなかった浄化槽があるため。（5人槽19基、6～7人槽26基、8～10人槽5基、計50基）

第2節 いのちを大切にする地域づくり

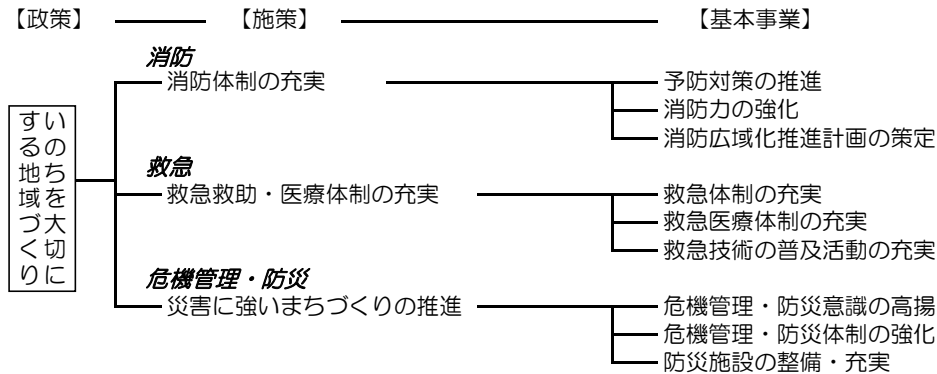

【消防体制の充実（消防力の強化）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
鳴門市消防団女性消防分団活動強化事業 担当課：消防総務課	女性消防団を活用し、独居老人宅の防火診断、各自治会等での初期消火訓練指導などを通じ市民への防火意識の高揚・啓発に努める。	継続 237	730	230	各種訓練・イベント等に積極的に参加し、市民の防火・防災の普及啓発を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,185	
新 消防団ポンプ積載車・小型動力ポンプ整備事業 担当課：消防総務課	東南海・南海地震の際、同時多発火災の発生が想定されることから消防団に配備している設備を定期的に更新し、地域の消防力を強化する。	実施 11,700	継続 11,700	11,700		進捗状況 計画どおり 決算見込み 11,700	
重8-7 消防緊急車両整備事業 担当課：警防課	火災・救急救助活動を行うため、本部と大麻分署に配備している救急車、消防ポンプ車等を順次更新する。	継続 -	27,500	-	進捗状況 未着手 決算見込み -	更新時期を延伸したため。	

【消防体制の充実（消防力の強化） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-7 高機能消防指令センター 総合整備事業	迅速で正確な救急救助活動を行うため、消防通信指令システムの再整備を検討する。					進捗状況 未着手 決算見込み —	調査研究中
担当課：警防課		継続 —	—	—			

【消防体制の充実（消防広域化推進計画の策定）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
消防広域化推進計画策定 事業	東南海・南海地震をはじめとする新たな消防需要に対応するとともに、消防事業の効率化・広域化を進めるため、鳴門市消防広域化推進計画を策定する。本年度は計画策定の基礎となる消防力最適配置調査を実施する。				消防力最適配置調査を実施し、消防広域化推進に向け研究を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,993	
担当課：消防総務課		調査・研究 3,300	—	—			

【救急救助・医療体制の充実（救急体制の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-7 救急救命士養成事業	救急患者の救命率の向上と救急医療の高度化を推進するため、救急救命士を計画的に養成する。				救急救命士1名養成	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,447	
担当課：警防課		継続 2,869	5,730	5,730			

【救急救助・医療体制の充実（救急医療体制の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(新) AED（自動体外式除細動器）整備事業 担当課：教育総務課	保健体育やスポーツ活動における生徒の事故、及び学校行事等における保護者や地域住民の事故等に備えるため、心停止の救命措置としてAED（自動体外式除細動器）を市内各中学校に配備する。	実施 454	継続 450	450	市内各中学校にAED（自動体外式除細動器）を配備した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 356	

【災害に強いまちづくりの推進（危機管理・防災意識の高揚）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重8-1) 地震等災害対策普及啓発事業 担当課：防災安全課	東南海・南海地震や台風などによる風水害に関する普及啓発活動を行うとともに、各種ハザードマップを作成し、地震や風水害時の防災活動や地震発生時の対応について周知徹底を図る。	継続 625	3,750	3,750	災害時に要援護者となりうる外国人を対象に、国際防災アカデミーを開催した。女性学級等の行う講習会に講師として参加するなど、啓発普及に努めた。講習会等に配布する資料（ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ）を購入し、配布した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,808	
(重8-6) 急傾斜地崩壊対策事業 担当課：土木課	土砂災害が発生するおそれのある危険な箇所について、緊急性の高いものから対策工事を順次行う。	継続 5,500	8,500	8,500	大浦地区急傾斜崩壊対策工事 L=28.0m 小海地区急傾斜崩壊対策工事 L=11.5m	進捗状況 計画どおり 決算見込み 8,500	

【災害に強いまちづくりの推進（危機管理・防災体制の強化）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重7-2-8-3) CATV災害情報提供システム整備事業 担当課：秘書広報課	平成16年度に整備したCATVへの災害情報提供システムを充実するため、関係機関が設置している定点カメラなどの映像も災害情報として提供する。	継続 4,573	4,500	4,500	文字と音声のみによる放送に加え、平成18年3月からは国土交通省設置の旧吉野川河口定点カメラの映像を無線によって受信できるようになった。（平成18年9月17日台風13号接近時に利用）	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,573	

【災害に強いまちづくりの推進（危機管理・防災体制の強化） 続き】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-1 自主防災組織結成・活動促進事業	大規模災害発生時に、地域の救助活動や避難誘導等の初期防災活動を行い、被害を少なく抑えるために、市民の危機意識の向上を図りながら、自主防災組織の結成促進を図り、結成後の活動を支援し、防災訓練を行う。	継続			自主防災会に対し、活動を支援するため補助金を交付した。また、自主防災会未結成地区における研修会等を行った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,473	
担当課：防災安全課・警防課		1,496	2,880	2,000			
重8-2 危機管理・防災マニュアル整備事業	全庁的・総合的な危機管理防災体制の確立に向け、東南海・南海地震や風水害などの大規模災害に対する計画の策定や危機管理マニュアルを整備する。	継続			「鳴門市危機管理指針」に基づき、各課へマニュアルを作成するよう周知した。	進捗状況 未達成 決算見込み -	各課で危機管理マニュアルを作成し、最善のマニュアルができるよう共に検討していくため、平成20年度まで延長して行っていく。
担当課：防災安全課		-					
重8-2 地域防災対策徳島大学連携事業	徳島大学との共同研究により鳴門市地域防災計画を見直し実践的な防災対策を推進するとともに、各種ハザードマップの原案を作成する。	継続			徳島大学と共同研究を行い、数値情報の分析を進めた。また、洪水ハザードマップと津波ハザードマップの原案を作成した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 7,101	
担当課：防災安全課		5,600	2,300				
新 重8-2 鳴門市国民保護計画策定事業	国の策定した国民保護法、県の策定した国民保護計画を受けて、住民の避難、安否情報や救援等の具体的な方法を盛り込んだ「国民保護計画」を策定する。	実施			鳴門市国民保護協議会において承認を受け、後日、徳島県知事にも同意を得、「鳴門市国民保護計画」を策定した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 2,394	
担当課：防災安全課		2,730					
重8-4 広域応援体制整備・強化事業	広域応援協定に基づく防災訓練に参加し、災害発生に備え相互応援体制を強化する。	継続			近畿ブロック緊急消防援助隊合同訓練	進捗状況 計画どおり 決算見込み 20	
担当課：警防課		50	100	100			

【災害に強いまちづくりの推進（防災施設の整備・充実）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績	
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-2 災害緊急整備事業（5ヵ年）	東南海・南海地震や台風などによる風水害に備え、災害緊急対策として必要な資機材の整備充実を図るとともに、市民が避難所で安心できるよう施設の環境等の整備を推進する。	継続			備蓄食糧（アルファ米）を購入し、木津・川東・中央の各支部へ配布し、本部用に粉ミルクを購入した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 654
担当課：防災安全課・その他関係課		1,100	1,330	1,330		

【災害に強いまちづくりの推進（防災施設の整備・充実）続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績	
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重8-5 公共施設等耐震化事業	東南海・南海地震に備え、防災拠点施設となる公共施設について、緊急に整備すべき施設から年次的、計画的に耐震化を進める。	継続			庁内における大地震等の災害を軽減するため、各課におけるロッカー等の固定を周知・徹底した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -
担当課：防災安全課・その他関係課		-	-	-		
重8-5 道路橋梁耐震化事業	近い将来発生すると予想される東南海・南海地震に対応すべく広域避難場所への避難路に架かる3橋（城見橋・大代谷橋・木津神橋）の耐震補強を行う。	継続			大代谷橋耐震設計業務 業務延長L=38.9m 大代谷橋耐震工事 施工延長L=38.9m	進捗状況 計画どおり 決算見込み 13,000
担当課：土木課		31,000	50,000			
新 重8-5 消防団拠点施設整備事業	狭小で老朽化している小森分団詰所について、耐震性を有する新たな詰所として新築移転する。	実施			小森分団詰所の移転新築を行った。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 18,333
担当課：消防総務課		22,571				
重8-5 競艇場施設耐震化事業	競艇場施設の耐震予備診断結果等により必要とされる施設の改良や耐震化の検討を進める。	検討			耐震予備診断で一部耐震補強の必要性などを指摘されており、特に早期対応が必要とされた部分について対策を検討した。	進捗状況 未達成 決算見込み -
担当課：競艇管理課		-	-	-		施設全体が老朽化していることから、全体的な改良や施設を維持していくための方法を検討しているが、厳しい経営状況下で結論を導き出せていない。

第3節 安心に包まれた暮らしづくり

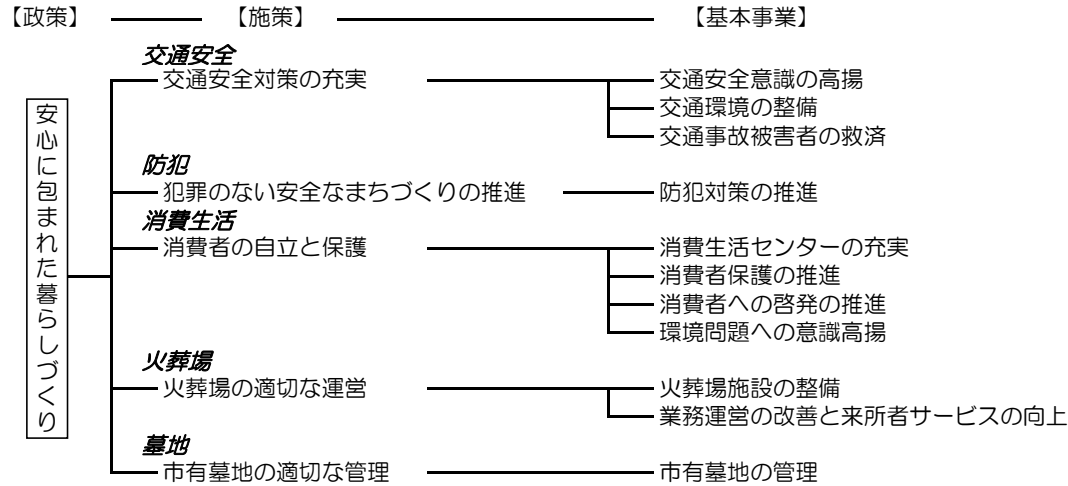

【交通安全対策の充実（交通環境の整備）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績	
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 踏切保安設備整備事業 担当課：防災安全課	交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、JR四国が行う踏切保安設備が整備されていない踏切の改良に対し支援する。	実施	継続		JR四国が行った踏切保安設備整備事業（町南第1踏切1種化工事）に対し、踏切保安設備整備事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,319
		5,700	5,700			

【犯罪のない安全なまちづくりの推進（防犯対策の推進）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>○新</p> <p>防犯ブザー配布事業</p> <p>担当課：防災安全課</p>	<p>児童犯罪への対策として有効とされる防犯ブザーを市内小学生に配布する。</p>	<p>実施</p> <p>315</p>	<p>継続</p> <p>310</p>	<p>310</p>	<p>FM徳島から市内の小学1年生に対し、防犯ブザーが寄贈されたため、市として配布は行わなかった。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>0</p>	

【火葬場の適切な運営（火葬場施設の整備）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>○重3-6</p> <p>火葬場改修整備事業</p> <p>担当課：衛生センター</p>	<p>老朽化した火葬炉の更新、耐震整備を行うとともに市民サービスの向上を図る。</p>	<p>継続</p> <p>85,107</p>	<p>219,300</p>		<p>実施設計（耐震設計含）を行い、解体工事に着手した。また、仮設施設の供用を開始した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>未達成</p> <p>決算見込み</p> <p>34,603</p>	<p>関係機関との協議に不測に日数を要したため、工事開始が遅れ、年度内の完成に至らず、一部を平成19年度に繰り越した。</p>

第4章 郷土を愛し思いやりに満ちた次代を担うひとづくり
 第1節 たくましい個性あふれるひとづくり



(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-1 教育振興計画策定事業 担当課：教育振興室	本市の教育を見直し、新しい時代にふさわしい教育のあり方を構築するため、鳴門市教育振興計画を策定する。	継続 1,150	→ 400		各中学校区での懇談会を開催し、保護者や地域の方々の意見や提言を伺い、これらを参考に審議会において審議を重ね、パブリックコメント手続などを経て、基本計画を策定した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 832	

【幼稚園教育の充実（教育環境の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
新 幼稚園教育用コンピュータネットワーク整備事業 担当課：教育研究所	市内全幼稚園に対して、CATV回線によるインターネット接続環境を構築し、周辺機器及び周辺機器を活かすソフトウェアを導入する。	実施 3,276	→ 継続 1,600	1,600	市内全幼稚園にCATV回線によるインターネット接続環境を整備し、カラープリンタ及びホームページ作成用のソフトを導入した。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 3,016	

【幼稚園教育の充実（子育て支援の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重1-2 午後保育（預かり保育）事業 担当課：学校教育課	幼稚園での教育終了後、家庭での保育が困難な園児を対象に、幼稚園施設を開放して実施されている午後保育（預かり保育）事業を支援する。	継続 19,890	→ 19,890	19,890	幼稚園での教育終了後、家庭での保育が困難な園児を対象に、幼稚園施設を開放して午後保育（預かり保育）を実施した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 22,253	

【義務教育の充実（教育環境の整備）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-2 学校防犯施設整備事業	教育現場の実情にあわせ、学校防犯・不審者対策として、各学校（幼・小・中）に緊急通報インターホンの設置や門扉・フェンスの整備を行う。	継続 9,250	9,200	9,200	第一小他3校の門及びフェンスの設置工事をはじめ、撫養幼他2園・2小学校・1中学校の防犯灯等の設置工事を実施した。また、緊急通報インターホンを鳴門東小に設置した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 9,533	
重6-2-8-5 小学校施設耐震化推進事業	耐震化優先度調査を行い、その結果を踏まえ平成19年度に策定される教育振興計画との整合性を図り、鳴門市学校施設耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を継続的に実施する。	継続 2,290	2,400	-	小学校校舎7校及び屋内運動場12校の耐震化優先度調査を実施した。小学校施設の優先度調査については平成18年度で完了。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 4,799	
重6-2-8-5 中学校施設耐震化推進事業	耐震化優先度調査を行い、その結果を踏まえ平成19年度に策定される教育振興計画との整合性を図り、鳴門市学校施設耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を継続的に実施する。	継続 854	700	-	中学校校舎3校及び屋内運動場6校の耐震化優先度調査を実施した。中学校施設の優先度調査については平成18年度で完了。	進捗状況 前倒し実施 決算見込み 2,342	

【義務教育の充実（教育内容の充実）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重3-3 学校におけるごみの減量・リサイクル推進事業	学校の給食残滓のリサイクルを実施し、学校から排出される生ごみを減量するとともに、生ごみの堆肥化を通じ児童生徒の環境教育を推進する。	継続 276	270	270	小・中学校の給食残滓を児童生徒がEMによる生ごみの堆肥化を行い、学校菜園等に再利用するなどによって、体験的な環境教育の実践と食育の推進に効果をあげた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 274	
外国青年招致事業（再掲あり）	国際社会への対応がますます求められているなか、学校における国際理解教育の充実を図る。	継続 13,178	15,110	17,720	小学校に1名、中・高等学校に2名の英語指導助手を派遣し、国際理解教育並びに英語教育の充実に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 12,857	

【義務教育の充実（学校給食の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重5-5</p> <p>地場産品の活用と食育の推進事業</p> <p>担当課：教育総務課</p>	<p>地産地消の観点から、学校教育の教科学習や調理実習での地場産品の学習をおこなうとともに、地域の特産物を使った学校給食の推進を図り、食を通じて地域に根ざした教育の実践に努める。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>単独校・給食センターにおいて、給食の食材購入時に地場産品の活用を指導するとともに、各学校の栄養士、調理員を対象に研修会を開催した。また、市内全幼・小・中学校の学校給食に地元産米を使った米飯給食を10月から実施した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	
<p>重6-2</p> <p>学校給食のセンター化事業</p> <p>担当課：教育総務課</p>	<p>児童生徒数の減少、施設の老朽化、衛生管理の強化などの課題に対応するため、大麻学校給食センターへの組み入れやドライ運用の充実を図る。</p>	<p>継続</p> <p>543</p>	<p>540</p>	<p>540</p>	<p>平成18年度策定の教育振興計画基本計画で、市内の学校給食全体の方向性を明確に位置づけた(①完全学校給食の継続実施 ②学校給食をセンター調理方式を基本として推進)。また、自校調理場の学校給食においては、ウエット方式からドライ運用に拡大を図った。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>543</p>	

【高等学校教育の充実（教育内容の充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>豊かな体験活動事業</p> <p>担当課：鳴門工業高校</p>	<p>豊かな人間性や社会性をはぐくむための体験学習などを推進する。</p>	<p>継続</p> <p>300</p>	<p>300</p>	<p>300</p>	<p>第1学年では、「類コース制」の特徴を生かすために、企業・大学などで見学・体験活動を実施。第2学年では、工業高校生としてプレゼンテーション能力・コミュニケーション能力の育成を図るため生徒出前講座の実施。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>300</p>	
<p>外国青年招致事業（再掲あり）</p> <p>担当課：教育研究所</p>	<p>国際化社会への対応がますます求められているなか、学校における国際理解教育の充実を図る。</p>	<p>継続</p> <p>13,178</p>	<p>15,110</p>	<p>17,720</p>	<p>小学校に1名、中・高等学校に2名の英語指導助手を派遣し、国際理解教育並びに英語教育の充実を努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>12,857</p>	

【大学連携の推進（地域社会における連携）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-8 地域文化財教育活用プロジェクト	鳴門教育大学・大塚国際美術館・本市が連携し、地域の文化施設を活かした、子どもに豊かな文化体験学習の機会を提供する。				子ども達が芸術と出会い、発見する楽しさを体感することを目的として大塚美術館でN*CAPを4回実施。延べ148人の児童が芸術体験活動に参加した。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：文化交流推進課		継続					

【大学連携の推進（学校教育における連携）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-8 インターンシップ事業	教員を志望する大学生及び大学院生を対象に、教育実践力の向上を促進するため、教育現場（幼・小・中学校）における研修の機会を提供する。				鳴門教育大学から依頼された教員採用試験に合格した学生等を、市内の幼稚園・小・中学校で受け入れ、教育実践力の強化を図り、子ども理解を深めるとともに、教員としての業務をより円滑に進めることができるよう指導をした。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：学校教育課		継続					

【生涯学習の推進と青少年の健全育成（学習活動の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-4 各種学級（女性・成人・高齢者学級）開設事業	学習内容の充実や学習方法の改善を図るとともに、各種学級の効率的な運営を進め、自主的かつ主体的な活動を促進する。				地域の女性・高齢者・成人学級は次第に自主的に運営ができるようになってきた。特別講座「近所の鳴門学」は地域を見直すきっかけになり、満足度の高い講座となった。市内全域を対象とした「うずしお女性学級」は、さまざまなテーマを取り上げた変化に富んだ講座が開設できた。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：生涯学習課		継続				586	

【生涯学習の推進と青少年の健全育成（公民館活動の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重6-4 公民館活用推進事業 担当課：生涯学習課	地域のニーズ・実情に添いながら、これまで以上に地域との協働による公民館運営を進め、弾力的で独自性を生かした活動を展開する。	継続 22,060	22,060	22,060	有人(大型)公民館については、自治振興会に運営の一部を委託して二年経過し、各地域との協働的公民館運営が徐々に充実してきている。また、各公民館運営で地域に沿った独自性もみられるようになり、良い方向に進んでいる。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 22,400	

【生涯学習の推進と青少年の健全育成（青少年健全育成の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重1-2 地域子ども教室推進事業 担当課：生涯学習課	国の事業として、鳴門市地域子ども教室実行委員会を設立し、地域の協力を得て実施されるさまざまな体験活動などを盛り込んだ、子どもの居場所づくりを促進する。	継続 (10,298)			平成17年度より1教室多い8教室で事業が実施できた。また、子ども待機スペース交流活動推進事業を2小学校で実施でき、安全で安心できる子どもの居場所が確実に広がった。また、地域で子どもを育てる雰囲気が醸成された。	進捗状況 完了・終了 決算見込み (9,897)	

【市民参加の図書館運営の推進（図書館活動の推進）】

(単位：千円)


事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重6-4 NPO法人との協働による図書館運営事業 担当課：生涯学習課・図書館	図書館業務の一部委託等、NPO法人との協働による図書館運営を充実させ、開館時間延長など利用者へのサービスの向上を図る。	継続 5,950	5,950	5,950	図書館業務の一部委託においては、カウンター業務支援をはじめ月末館内整理等予定どおり実施出来た。また、NPO法人のボランティア活動も充実していた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 5,950	
重6-4 図書館資料提供サービス事業 担当課：生涯学習課・図書館	図書資料の完全データベース化を進め、市内小中学校とのネットワーク活用をさらに図るとともに、インターネット検索システムの拡充や市域を越えた広域的な図書館運営の検討を進める。	継続 453	4,520	4,520	新図書館システムを導入し、自宅からインターネットや携帯電話で蔵書検索や予約が可能になった。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 613	

【生涯スポーツの振興（スポーツ活動の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>○新</p> <p>徳島ヴォルティスホームタウン連携事業</p> <p>担当課：商工観光課</p>	<p>徳島ヴォルティスホームタウンの自治体が連携して、チームへの支援策等を検討しイベントや周知・集客事業を展開する。</p>	<p>実施</p> <p>100</p>	<p>継続</p> <p>100</p>	<p>100</p>	<p>徳島ヴォルティスホームタウン協議会加盟市町と連携し、イベント出展やPR事業10件及び広報事業としてHP修正やパンフレット作成など3件を実施した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>100</p>	
<p>○重6-4</p> <p>体育行事支援事業</p> <p>担当課：体育振興室</p>	<p>各種体育行事に対する支援を行うことにより、児童生徒に競技スポーツを体験する機会を提供し、学校体育の振興と青少年の健全育成を図る。</p>	<p>継続</p> <p>1,007</p>	<p>1,000</p>	<p>1,000</p>	<p>平成18年度における体育行事（スポーツ少年団、小・中学校）開催事業は計画どおり実施するとともに、各種競技大会等の支援に努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>988</p>	
<p>○重6-4</p> <p>競技力向上対策支援事業</p> <p>担当課：体育振興室</p>	<p>鳴門市体育協会を母体とし、体育・スポーツ諸団体の強化及び競技力の向上等を図る。</p>	<p>継続</p> <p>1,380</p>	<p>1,380</p>	<p>1,380</p>	<p>各競技団体において、市民体育祭、各種競技大会、スポーツ教室等を積極的に開催し、有能な選手の発掘、強化育成を図りながら本市における競技力の向上及び競技人口の拡大に努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,380</p>	
<p>○重6-4</p> <p>総合型地域スポーツクラブ設立事業</p> <p>担当課：体育振興室</p>	<p>生涯スポーツ社会の実現を目指して、誰もが気軽に参加できる住民主体の総合型地域スポーツクラブの組織づくりを推進する。</p>	<p>継続</p> <p>75</p>	<p>50</p>	<p>100</p>	<p>鳴門市体育指導委員会・NPO法人OHなると・体育協会関係者等で総合型地域スポーツクラブ設立を考える会を結成し、当クラブ設立に向け協議を重ねた。※平成19年4月、鳴門市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会を発足</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>56</p>	

第2節 文化にふれあう感性豊かなひとづくり



【暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進（施設の事業充実）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間 (下段：事業費)			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重6-7) 第九演奏会開催事業 担当課：文化交流推進課	ベートーヴェンの第九交響曲「日本初演の地」という歴史的背景を活かして第九演奏会を開催し、まちづくり・観光情報として全国に発信する。	継続 5,100	1,800	1,800	「文化会館活性化事業」と統合	進捗状況 決算見込み	
(重6-7) 賀川豊彦記念館活性化事業 担当課：文化交流推進課	平成18年度より指定管理者制度を導入し、調査研究及び事業の企画実施を充実させるなど、賀川豊彦記念館の活性化を図る。	継続 2,225	2,220	2,220	4月1日より指定管理者制度を導入し、賀川豊彦記念・鳴門友愛会による管理運営を開始。民間活力を活かした館の活性化に取り組んだ。	進捗状況 完了・終了 決算見込み 2,225	
(重6-7) 文化会館活性化事業 担当課：文化会館	文化会館の活性化を図るため、自主事業の拡充や多面的利用を推進するとともに、指定管理者制度の導入を検討する。	継続 102	760	760	平成19年度の「第九」は①定例公演の第九と②国民文化祭の「第九」との2回公演になることから、平成18年度は国文祭のプレとして実施し、全日本「第九を歌う会」連合会や県外にPRすることが出来た。また、映画「ハルトの楽園」の試写会を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 4,970	

【暮らしの中で文化と創造が息づくまちづくりの推進（文化・芸術活動の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-7 文化振興事業 担当課：文化交流推進課	鳴門市芸術祭の開催など、市民が文化・芸術に親しむことのできる機会の拡充を図るとともに、市民が主体的に参加する個性的な地域文化の創造を促進する。	継続 810	810	810	鳴門市芸術祭を開催するとともに、市民ギャラリー展の充実を図った。また、市民が主体的に参加する個性的な地域文化の創造を促進するための指針となる「鳴門市文化のまちづくり条例」を12月25日に制定し、平成19年4月1日から施行した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 810	
重6-7 第22回国民文化祭とくしま2007開催事業 担当課：国民文化祭推進室	平成19年度に徳島県で開催される国民文化祭の成功に向けて、実行委員会を設立して準備を進めるとともに、開催を通じて地域文化の振興や文化・芸術活動の推進を図る。	プレ大会開催 1,154	本大会開催 18,000		鳴門市実行委員会及び主催3事業の事業別企画委員会の開催。プレ大会（第25回第九交響曲演奏会・茶会）の開催。広報宣伝活動の実施。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 1,154	
新 重6-7 第28回日本文化デザイン会議'06 in とくしま開催事業 担当課：国民文化祭推進室	日本を代表する文化人が一同に会し、多様なプログラムを通じて、地域の活性化について熱心に論議し、全国発信することを目的に、国民文化祭のイベントとして開催する。	実施 6,000			第28回日本文化デザイン会議の開催。本市では、大塚国際美術館で美術館ページントや陶板ワークショップを開催。また、ドイツ館では同時開催イベントとして、講演会・茶会を開催した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 6,000	

【文化財の保護と活用（文化財の保護と活用）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
福永家住宅・塩田保存活用事業 担当課：生涯学習課	国指定重要文化財に指定されて29年が経過しているが、劣化が著しく、その保護管理を進めるための環境整備を行う。	継続 625	10,000	10,000	指定文化財の管理指導を行い、除草及び防災施設保守点検を行った。また、保護管理及び公開活用を円滑に進めていくための方法について、所有者と協議を行い、譲渡の方向で話し合いを進めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 2,707	
鳴門板野古墳群整備活用事業 担当課：生涯学習課	歴史上また学術上価値が高く国指定史跡の指定候補の古墳を中心に、県と協調して環境整備および調査活動を行う。	継続 3,580	2,240	2,240	鳴門板野古墳群内の2地域の古墳群について、築造年代確認のための発掘調査を実施した。また、県の事業として、群内の弥生時代終末期の墳墓の築造年代確定の発掘調査が実施された。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 3,580	

【文化財の保護と活用（文化財の保護と活用） 続き】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
市域内出土収集文化財活用事業	市内で生産・使用された民俗資料及び埋蔵文化財出土資料について、今後これらの資料を一般に公開ができる施設と利用方法を具体的に検討し、展示施設を開設する。				所蔵する資料について、展示会の開催や出前講座による資料活用、他機関への貸出しを行った。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：生涯学習課		継続					

【国際・国内交流の推進（交流のひとつづくり）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-5 交流推進事業	交流活動の活発化を目的とする市民・民間団体が主体となった協議会を設立し、歴史と文化に培われた文化を基盤とした姉妹都市や親善都市との交流により、市民主導の交流のまちづくりを目指す。				市民レベルでの国内外との交流活動を一層推進していくため、市民・民間団体が主体となった「鳴門市民交流推進協議会」を設立した。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：文化交流推進課		継続					


【国際・国内交流の推進（交流のものづくり）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重6-5 ドイツ館活性化事業	日独国際交流の中核施設として、指定管理者制度の導入も含めたドイツ館の整備充実を図るとともに、ドイチェスフェストを開催するなどして積極的に国内外への情報発信を行う。				映画「バルトの楽園」で再現された板東俘虜収容所に関する歴史を、映画撮影時の写真と現存する写真で振り返る企画展を行った。また、10月15日に「ドイチェス・フェストinなると」を開催した。	進捗状況	
				計画どおり			
				決算見込み			
担当課：ドイツ館		継続	27,880	27,000	27,000	27,880	

第5章 市民と歩むまちを支える行財政の仕組みづくり
第1節 市民と協働する開かれたまちづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____



【開かれた行政と市民参画の推進（開かれた行政と市民参画の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
<p>重9-1</p> <p>情報公開・個人情報保護事務</p> <p>担当課：総務課</p>	<p>ファイリングシステムを活用し、守るべき情報は守り、市政に関する情報は積極的に公表し、行政の説明責任を十分に果たして、公正の確保と透明性の向上を図る。</p>	<p>継続</p> <p>1,675</p>	<p>1,490</p>	<p>1,490</p>	<p>情報公開条例、個人情報保護条例に基づき適正な手続きを進め、情報公開については76件、個人情報保護は簡易開示を含む41件の請求に対し、開示等を行った。また、文書を保存するための書庫の整備を進めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,621</p>	
<p>重9-1</p> <p>「広報なると」発行事業</p> <p>担当課：秘書広報課</p>	<p>一層読みやすい「広報なると」の紙面作りとして、掲載内容などを検討し広報紙の充実を図る。</p>	<p>継続</p> <p>7,341</p>	<p>7,530</p>	<p>7,550</p>	<p>一層読みやすい紙面作りとして、市民が参加する活動・イベントの記事掲載や、理解しやすいようグラフや表を活用した。また、年2回、紙面4ページをカラー化した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>6,872</p>	
<p>重9-1</p> <p>行政評価導入事業</p> <p>担当課：企画調整課（旧企画情報課）</p>	<p>総合計画の推進を図るためのツールとして行政評価システムを導入し、各事業の再点検を行い、限りある財源の中で効果的・効率的な行政運営を推進する。</p>	<p>継続</p> <p>1,210</p>	<p>1,210</p>	<p>1,210</p>	<p>助役から事業担当者まで階層に応じた職員研修を実施するとともに、総合計画実施計画を基本に選定した104事業の事務事業評価を行い公表した。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>1,171</p>	
<p>重9-1</p> <p>広域連携調査研究事業</p> <p>担当課：企画調整課（旧企画情報課）</p>	<p>市民サービスの向上や効率化の観点から、広域行政、市町村合併についての調査・研究を進める。</p>	<p>継続</p> <p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>市民意識調査の実施時において、市町村合併に関する項目を設定を行い、市民ニーズの把握に努めた。また、徳島県市町村合併推進審議会へ本市の考えを示すとともに、近隣市町の動向の把握に努めた。</p>	<p>進捗状況</p> <p>計画どおり</p> <p>決算見込み</p> <p>—</p>	


【開かれた行政と市民参画の推進（開かれた行政と市民参画の推進） 続き】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重9-1 特区・地域再生制度活用 研究事業	本市の特性を活かした構造改革特別区域制度の導入及び地域再生について調査・研究を行うとともに、可能なものについては申請を行う。				事例を調査・研究し、庁内協議を行った。	進捗状況 計画どおり	
継続				決算見込み —			
担当課：企画調整課（旧企画情報課）		—	—	—			

第2節 時代を拓く行財政のシステムづくり

【政策】 _____ 【施策】 _____ 【基本事業】 _____



【効率的・効果的な行財政運営の推進（財政の健全化）】

（単位：千円）

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容	進捗状況	計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
(重9-3) 財政健全化計画推進事業 担当課：財政課	財政健全化計画に基づき、市の行財政運営の将来像を展望し計画を推進する。	継続 —	—	—	平成18年6月に「財政健全化計画」の見直しを行い改訂版を策定し、平成19年度予算編成において、使用料・手数料等の見直し、補助金の整理合理化等に取り組んだ。また、平成17年度決算における普通会計のバランスシートや行政コスト計算書等を公表した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み —	
市税徴収率向上対策事業 担当課：税務課	主要財源の安定的な確保や公平性の確保から、口座振替を推進し、徴収事務を充実・強化させるとともに平成18年度から徳島滞納整理機構に参画し徴収率の向上を図る。	継続 13,345	13,340	13,340	徳島滞納整理機構に40事案を移管し、また県市合同徴収や、休日税務相談、口座振替推進キャンペーン、租税債権の徴収を目的とした滞納処分への転換等の施策を実施。徴収率は現年分97.96%、滞納繰越分13.2%、全体で87.44%とすべて前年度を上回った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 12,226	
(新) 市営住宅家賃滞納整理事業 担当課：都市住宅課	市営住宅の家賃滞納整理をすることで、市営住宅使用料収入の収入未済額を減少させるとともに、入居者間の不公平感の解消を図り健全な住宅運営を実施する。	実施 640	継続 1,920	1,920	悪質な家賃滞納者に対する納付相談を行い、応じない場合は滞納処分の法的手続きを取るなど、市営住宅使用料収入の確保に努めた。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 210	

【効率的・効果的な行財政運営の推進（行政改革の推進）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績		
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)
重9-4 集中改革プラン推進事業 担当課：総務課	集中改革プランの着実な実施により、危機的な財政状況から脱却し、財政健全化を図るとともに、市民サービスの向上と簡素で効率的な行財政システムを確立する。	継続			定員管理・給与の適正化、民間委託等の推進などの各取り組み事項の推進に努めた。職員数は全会計で32人削減し、平成18年度決算速報値において、経常収支比率は92.6%（前年度比1.6%改善）となった。	進捗状況 計画どおり 決算見込み -	
重9-4 窓口業務の一元化調査・研究事業 担当課：総務課	平成12年から市民課で税務証明等の発行を行っているが、市民の利便性向上のため、ワンストップサービスによる各種証明書発行事務や申請業務など窓口業務の一元化について調査・研究する。	継続			窓口業務一元化検討会において、市民アンケート及び主要窓口業務の分類、他都市の状況調査などを行い、窓口業務一元化についての調査・研究を行った。	進捗状況 完了・終了 決算見込み -	
重9-4 指定管理者制度導入事業 担当課：総務課	指定管理者制度の創設により、本市の公の施設の管理運営現況調査を行い、すでに委託しているものは平成18年度から指定管理者による管理に移行し、他施設も可能なものから順次移行する。	継続	75		勤労青少年ホーム、青少年会館、市場・川崎児童館の3施設について指定管理者制度導入に取り組み、平成19年4月から指定管理者制度に移行した。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 35	

【効率的・効果的な行財政運営の推進（適正な人事管理と職員の能力向上）】

(単位：千円)

事務事業名	事業概要	計画期間（下段：事業費）			平成18年度実績			
		H18年度	H19年度	H20年度	平成18年度の実施内容		計画通り実施できなかった理由(未達成又は未着手)	
重9-5 職員人材育成研修事業 担当課：人事課	「鳴門市人材育成基本方針」に基づき、地方分権時代にふさわしい職員の資質、能力の向上を図るため計画的な各種研修を実施する。	継続	6,393	6,390	6,390	各階層別研修、職務研修、課題別研修等を実施した。派遣研修については、自治大学校に2人、市区町村国内外研修プログラム1人、市町村職員中央研修所等に10人派遣するなど研修の充実を図った。	進捗状況 計画どおり 決算見込み 6,131	
